

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

2021

**Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e
Serviços de Segurança**

Título

Relatório de Execução de 2021

Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança

Autor

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna

Edição

Março 2022

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna

Rua de São Mamede, n.º 23

1100-533 Lisboa

www.sg.mai.gov.pt

Índice Geral

1.	Introdução.....	9
2.	A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS) 10	
3.	Análise Global – 2021.....	16
3.1.	Enquadramento Orçamental – Ótica da Receita	16
3.2.	Execução Orçamental – Ótica da despesa	18
3.3.	Indicadores de Execução Financeira	23
4.	Análise Detalhada	24
4.1.	Medida Infraestruturas.....	24
4.1.1.	Medida Infraestruturas – Execução Financeira	25
4.1.2.	Medida Infraestruturas – Execução Material	26
4.1.3.	Medida Infraestruturas – Compromissos Assumidos, para 2021.....	28
4.2.	Medida Veículos.....	29
4.2.1.	Medida Veículos – Execução Financeira	29
4.2.2.	Medida Veículos – Execução Material	30
4.3.	Medida Armamento.....	32
4.3.1.	Medida Armamento – Execução Financeira	32
4.3.2.	Medida Armamento – Execução Material	33
4.4.	Medida Equipamento de Proteção Individual	36
4.4.1.	Medida Equipamento de Proteção Individual – Execução Financeira.....	36
4.4.2.	Medida Equipamento de Proteção Individual – Execução Material.....	37
4.5.	Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	40
4.5.1.	Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional – Execução Financeira.....	40
4.5.2.	Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional – Execução Material.....	41
4.5.3.	Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional – Compromissos Assumidos para 2022 43	
4.6.	Medida Equipamento para Funções Especializadas	44

4.6.1.	Medida Equipamento para Funções Especializadas – Execução Financeira.....	44
4.6.2.	Medida Equipamento para Funções Especializadas – Execução Material	45
4.7.	Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação	47
4.7.1.	Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Execução Financeira	47
4.7.2.	Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Execução Material (Projeto 10359) 49	
4.7.3.	Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Compromissos Assumidos para 2022	50
5.	Saldos de Gerência.....	51
6.	Conclusões	54
	Anexo I – Medida Infraestruturas	56
	Anexo II – Medida Veículos.....	58
	Anexo III – Medida Armamento.....	59
	Anexo IV – Medida EPI.....	60
	Anexo V – Medida EAAOp.....	61
	Anexo VI – Medida EFE	62
	Anexo VII – Medida STIC	63

Índice de Quadros

QUADRO 1 - MAPA DE PROGRAMAÇÃO DA LPIEFSS NO PERÍODO 2017-2021	11
QUADRO 2 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, POR MEDIDA, RELATÓRIO ANUAL - 2017	12
QUADRO 3 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, POR MEDIDA, RELATÓRIO ANUAL - 2018	12
QUADRO 4 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, POR MEDIDA, RELATÓRIO ANUAL - 2019	12
QUADRO 5 – INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, POR MEDIDA, RELATÓRIO ANUAL - 2020	13
QUADRO 6 - INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO - 2017 A 2020.....	13
QUADRO 7 – INDICADORES DE EXECUÇÃO MATERIAL - 2017 A 2020.....	14
QUADRO 8 – QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO MATERIAL DA LPIEFSS, POR FSS E POR ANOS DE 2017 A 2021	15
QUADRO 9 - QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA LPIEFSS, POR FSS E POR ANOS DE 2017 A 2021	15
QUADRO 10 – INDICADORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2021 – ÓTICA DA RECEITA	17
QUADRO 11 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ORGANISMOS, EM 2021	17
QUADRO 12 - RECEITAS IMPOSTOS E RECEITAS PRÓPRIAS COBRADAS PELA SGMAI EM 2021	18
QUADRO 13 - ESTRUTURA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DA SGMAI, EM 2021	19
QUADRO 14 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA LPIEFSS, EM 2021	20
QUADRO 15 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR MEDIDAS DA LPIEFSS, EM 2021	21
QUADRO 16 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL POR PROJETO DA LPIEFSS, EM 2021	22
QUADRO 17 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS ENTRE MEDIDAS DA LPIEFSS, EM 2021	22
QUADRO 18 - INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, EM 2021	23
QUADRO 19 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA INFRAESTRUTURAS, EM 2021 (%)	26
QUADRO 20 – DETALHE DA EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA INFRAESTRUTURAS, EM 2021	27
QUADRO 21 - COMPROMISSOS FUTUROS ASSUMIDOS EM ANOS ANTERIORES NA MEDIDA INFRAESTRUTURAS	28
QUADRO 22 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA VEÍCULOS, EM 2021 (%)	30
QUADRO 23 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA ARMAMENTO, EM 2021 (%)	33
QUADRO 24 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA EPI, EM 2021 (%)	36
QUADRO 25 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA EAAOP, EM 2021 (%).....	40
QUADRO 26 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM ANOS ANTERIORES, NA MEDIDA EAAOP, PARA 2022	43
QUADRO 27 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA EFE, EM 2021 (%)	45
QUADRO 28 - EXECUÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL DA MEDIDA STIC, POR PROJETO, NO PERÍODO 2017-2021.....	47
QUADRO 29 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA STIC, EM 2021 (%)	48
QUADRO 30 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA STIC – PROJETO 10359, EM 2021 (%).....	49
QUADRO 31 - COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM ANOS ANTERIORES, NA MEDIDA STIC, PARA 2022	50
QUADRO 32 – SALDOS PASSÍVEIS DE TRANSITAR, PARA 2022	51
QUADRO 33 – SALDO POTENCIAL DE TRANSITAR, PARA 2022, POR FONTE DE FINANCIAMENTO	52
QUADRO 34 – EVOLUÇÃO DOS SALDOS DA LPIEFSS AO LONGO DO QUINQUÊNIO	53

Índice de Gráficos

GRÁFICO 1 - INDICADORES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO - 2017 A 2020	13
GRÁFICO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA INFRAESTRUTURAS, NO PERÍODO 2017-2021.....	25
GRÁFICO 3 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA INFRAESTRUTURAS, NO PERÍODO 2017-2021.....	26
GRÁFICO 4 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA INFRAESTRUTURAS VS INDICADOR OBJETIVO, POR FSS	27
GRÁFICO 5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA VEÍCULOS, NO PERÍODO 2017-2021.....	29
GRÁFICO 6 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA VEÍCULOS, NO PERÍODO 2017-2021.....	30
GRÁFICO 7 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA VEÍCULOS VS INDICADOR OBJETIVO, POR FSS	31
GRÁFICO 8 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA VEÍCULOS VS QUANTIDADES PREVISTAS PA2021, POR FSS	31
GRÁFICO 9 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA ARMAMENTO, NO PERÍODO 2017-2021	32
GRÁFICO 10 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA ARMAMENTO, NO PERÍODO 2017-2021	33
GRÁFICO 11 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA ARMAMENTO, POR FSS, EM 2021	34
GRÁFICO 12 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA ARMAMENTO VS INDICADOR OBJETIVO (ARMAS), EM 2021	34
GRÁFICO 13 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA ARMAMENTO VS INDICADOR OBJETIVO (ACESSÓRIOS), EM 2021	35
GRÁFICO 14 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA ARMAMENTO VS QUANTIDADES PREVISTAS PA2021, POR FSS	35
GRÁFICO 15 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA EPI, NO PERÍODO 2017-2021.....	36
GRÁFICO 16 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EPI, NO PERÍODO 2017-2021.....	37
GRÁFICO 17 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EPI, POR FSS, EM 2021	37
GRÁFICO 18 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EPI VS INDICADOR OBJETIVO (COLETES BALÍSTICOS), EM 2021.....	38
GRÁFICO 19 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EPI VS INDICADOR OBJETIVO (OUTROS EPI), EM 2021	38
GRÁFICO 20 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EPI VS QUANTIDADES PREVISTAS PA2021, POR FSS	39
GRÁFICO 21 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA EAAOP, NO PERÍODO 2017-2021	40
GRÁFICO 22 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EAAOP, NO PERÍODO 2017-2021	41
GRÁFICO 23 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EAAOP VS INDICADOR OBJETIVO, POR FSS, EM 2021	42
GRÁFICO 24 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EAAOP VS QUANTIDADES PREVISTAS PA2021, POR FSS	42
GRÁFICO 25 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA EFE, NO PERÍODO 2017-2021	44
GRÁFICO 26 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EFE, NO PERÍODO 2017-2021	45
GRÁFICO 27 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EFE VS INDICADOR OBJETIVO, POR FSS, EM 2021	46
GRÁFICO 28 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA EFE VS QUANTIDADES PREVISTAS PA2021, POR FSS.....	46
GRÁFICO 29 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DA MEDIDA STIC, NO PERÍODO 2017-2021.....	47
GRÁFICO 30 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA STIC, NO PERÍODO 2017-2021.....	49
GRÁFICO 31 - EXECUÇÃO MATERIAL DA MEDIDA STIC – PROJETO 10359, POR FSS, EM 2021	50

Índice de Tabelas

TABELA 1 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO FINANCEIRA, EM 2021, POR FSS – MEDIDA INFRAESTRUTURAS	56
TABELA 2 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, EM 2021 – MEDIDA VEÍCULOS	58
TABELA 3 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, EM 2021 – MEDIDA ARMAMENTOS	59
TABELA 4 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, EM 2021 – MEDIDA EPI	60
TABELA 5 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, EM 2021 – MEDIDA EAAOP	61
TABELA 6 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, EM 2021 – MEDIDA EFE	62
TABELA 7 - RESUMO DOS CONTRATOS COM EXECUÇÃO MATERIAL E FINANCEIRA, EM 2021 – MEDIDA STIC	63

Siglas, acrónimos e abreviaturas

Código dos Contratos Públicos	CCP
Divisão de Programação de Infraestruturas e Equipamentos	SGMAI-DPIE
Equipamentos de Apoio à Atividade Operacional	EAAOp
Equipamentos de Proteção Individual	EPI
Equipamentos para Funções Especializadas	EFE
Forças e Serviços de Segurança	FSS
Forças de Segurança	FS
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna	GSEAAI
Guarda Nacional Republicana	GNR
Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança	LPIEFSS
Plano de Aquisições para 2021	PA2021
Polícia de Segurança Pública	PSP
Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna	SGMAI
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	SEF
Sistema de Tecnologias de Informação e Comunicação	STIC

1. Introdução

A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS), aprovada pela Lei n.º 10/2017, de 3 de março, estabelece a programação dos investimentos na modernização e operacionalidade das FSS sob tutela do membro do Governo responsável pela área da administração interna, para o quinquénio de 2017 -2021. A programação referida prevê os encargos com investimentos em instalações, sistemas de tecnologias de informação e comunicação, veículos, armamento e outro equipamento necessário à prossecução das competências e atribuições das FSS.

O presente relatório reúne a informação necessária ao controlo da execução da LPIEFSS, durante o ano de 2021.

Este relatório evidencia a execução de cada medida, nas perspetivas orçamental e material, decorrentes dos contratos celebrados e compromissos assumidos bem como as responsabilidades futuras que deles resultam.

As entidades beneficiárias, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), colaboram com a SGMAI no planeamento, execução e monitorização da LPIEFSS.

Para a elaboração do presente Relatório, foram recolhidos contributos das seguintes unidades orgânicas da SGMAI:

- Direção de Serviços de Gestão Orçamental e Financeira;
- Direção de Serviços da Unidade Ministerial de Compras;
- Divisão de Programação de Equipamentos e Infraestruturas.

Como nota prévia, importa referir que todos os montantes apresentados em euros (€), incluem Imposto de Valor Acrescentado (IVA).

2. A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (LPIEFSS)

A LPIEFSS, publicada em 2017, veio instituir um novo modelo de gestão estrutural e plurianual dos investimentos, que assenta numa estrutura executiva da responsabilidade do membro do Governo responsável pela Administração Interna, uma entidade coordenadora, na figura da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) que assegura a sua gestão, a monitorização das execuções orçamental e material, a elaboração dos procedimentos de contratação e a elaboração dos relatórios periódicos.

No âmbito da LPIEFSS são beneficiárias pelos investimentos programados, no período 2017-2021, duas Forças de Segurança - a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) e um Serviço de Segurança - o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Adicionalmente, a SGMAI é beneficiária da LPIEFSS no âmbito da medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação (STIC), em projetos que têm um carácter transversal às FSS.

O ano de 2017 foi o primeiro ano de execução da LPIEFSS, em que foi necessário adequar as estruturas a um novo modelo de gestão de investimentos e, necessariamente, a novos processos de trabalho, quer ao nível do planeamento como da execução e da monitorização, obrigando ainda a definição de novos modelos de articulação entre as diversas entidades envolvidas.

Considerando que grande parte do investimento é realizado em benefício direto da GNR e da PSP, a SGMAI-DPIE foi estrategicamente dotada com recursos humanos qualificados das supracitadas forças de segurança para integrar a referida unidade, que apesar da constante mobilidade dos seus quadros e em défice atual, fomentou e fomenta a criação de condições orgânicas e funcionais para integrar a estrutura na SGMAI, garantindo-se a sua permanente articulação com a tutela setorial e com os seus beneficiários diretos.

Desde a criação da DPIE foram identificadas algumas oportunidades de melhoria na gestão das medidas da LPIEFSS que pretendem incrementar a economia, a eficiência e a eficácia, designadamente, nos procedimentos promovidos por esta divisão e que passam, entre outros, por uma expedita articulação entre a SGMAI e as FSS.

No Quadro 1, apresentam-se os investimentos estimados e preconizados na Lei nº10/2017, de 3 março, repartidos por sete medidas, no horizonte temporal de 2017 a 2021, constituindo o seu planeamento macro:

Quadro 1 - Mapa de Programação da LPIEFSS no período 2017-2021

(um: EUR)

Medida	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Infraestruturas	18.280.278	19.648.614	22.261.725	23.476.425	23.087.053	106.754.095
Veículos	4.155.000	11.120.000	16.100.000	15.400.000	15.500.000	62.275.000
Armamento	2.138.000	980.000	3.630.000	1.050.000	1.380.000	9.178.000
Equipamento de Proteção Individual	2.285.000	1.460.000	1.280.000	1.280.000	1.310.000	7.615.000
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
Equipamento para Funções Especializadas	3.066.546	2.865.000	1.890.000	1.960.000	2.320.000	12.101.546
Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação	60.496.661	53.847.871	44.759.760	46.755.060	46.324.432	252.183.784
Total	90.921.485	90.921.485	90.921.485	90.921.485	90.921.485	454.607.425

Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 2.º da LPIEFSS, as dotações orçamentais que se encontram no Mapa de Programação são inscritas ou transferidas para divisão própria do orçamento de projetos da SGMAI.

A determinação da execução da programação financeira da LPIEFSS desde 2017 incorpora os impactos resultantes dos ajustamentos decorrentes de saldos transitados, alterações orçamentais e da aplicação de cativos nas dotações iniciais de cada medida, constantes do Mapa de Programação da LPIEFSS.

Assim, o nível de execução é determinado tendo por base a execução financeira realizada em cada ano face à dotação disponível, a qual engloba os pagamentos realizados pela SGMAI e as transferências para as FSS relacionados com o investimento realizado, no âmbito da LPIEFSS.

Nos quadros seguintes são apresentados os indicadores de execução financeira da LPIEFSS, para cada uma das medidas, desde 2017 a 2020, constantes dos respetivos relatórios anuais, o que se pode concluir que a média da execução financeira nestes 4 últimos anos ronda os 58,06%, um pouco abaixo do que era expectável.

Será ainda de referir, conforme se poderá verificar no Relatório Execução de 2020 que houve a necessidade de efetuar pequenas correções aos relatórios anteriores, ao nível da execução material e financeira entre medidas, contudo estas correções não têm qualquer implicação ao nível da execução material e financeira global anual.

Quadro 2 – Indicadores de Execução Financeira, por medida, Relatório Anual - 2017

(um: €)

Execução LPIEFSS	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	18 230 278	4 155 000	2 138 000	2 285 000	500 000	3 066 546	60 496 661	90 871 485
Ao entre medidas (2)	0	-1 041 291	0	0	0	-709 145	1 750 436	0
Saldos transitados e AO para outros projetos (3)	0	0	0	0	0	0	350 414	350 414
Dotação Corrigida (4) = (1) + (2) + (3)	18 230 278	3 113 709	2 138 000	2 285 000	500 000	2 357 402	62 597 511	91 221 899
Cativo (5)	0	1 858 125	0	0	54 631	335 059	12 229 577	14 477 392
Dotação corrigida líquida de cativos (6) = (4) - (5)	18 230 278	1 255 584	2 138 000	2 285 000	445 369	2 022 343	50 367 934	76 744 507
Pagamentos (7)	1 442 042	0	887 783	493 946	53 339	425 727	49 646 148	52 948 986
Transferências para as FSS (8)	2 504 341	1 255 584	79 824	0	391 537	344 111	68 665	4 644 062
Saldo da medida (9) = (6) - (7) - (8)	14 283 895	0	1 170 393	1 791 054	493	1 252 504	653 121	19 151 459
Execução financeira (10) = (7) + (8)	3 946 383	1 255 584	967 607*	493 946**	444 876	769 838***	49 714 813	57 593 048
Execução financeira % (11) = (10) / (6)	21,65%	100,00%	45,26%	21,62%	99,89%	38,07%	98,70%	75,05%

(*) Execução financeira constante do Relatório Anual de 2017, contudo devido à reclassificação de alguns bens, deveria ter sido considerado 1.067.109EUR (Ver 4.3.1 do Relatório de Execução de 2020)

(**) Execução financeira constante do Relatório Anual de 2017, contudo devido à reclassificação de alguns bens, deveria ter sido considerado 486.012EUR (Ver 4.4.1 do Relatório de Execução de 2020)

(***) Execução financeira constante do Relatório Anual de 2017, contudo devido à reclassificação de alguns bens, deveria ter sido considerado 678.270EUR (Ver 4.6.1 do Relatório de Execução de 2020)

Quadro 3 – Indicadores de Execução Financeira, por medida, Relatório Anual - 2018

(um: EUR)

Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	19 598 614	11 120 000	980 000	1 460 000	1 000 000	2 865 000	53 847 871	90 871 485
Saldo da Gerência Anterior (2)	12 124 944		1 170 393	1 791 054				15 086 391
Reforços da LPIEFSS - Dotação Centralizada combate a incêndios e projeto Cadernos Eleitorais e projeto Modernização da SGMAI (3)							8 997 778	8 997 778
Crédito Especial de RP (4)							1 922 650	1 922 650
Transferências para as FSS (5)	2 313 424							2 313 424
Alterações orçamentais entre medidas (6)	0	-2 857 990	0	0	0		2 857 990	0
Dotação Corrigida (7) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) + (6)	29 410 134	8 262 010	2 150 393	3 251 054	1 000 000	2 865 000	67 626 289	114 564 880
Cativo (8)	0	1 390 001	0	0	125 000	358 125	6 023 294	7 896 420
Dotação corrigida líquida (9) = (7) - (8)	29 410 134	6 872 009	2 150 393	3 251 054	875 000	2 506 875,0	61 602 995	106 668 460
Pagamentos (10) (*)	967 951	2 986 592	1 437 893	1 844 582	417 361	1 587 575	51 864 524	61 106 479
Saldo da medida (11) = (9) - (10)	28 442 183	3 885 417	712 500	1 406 472	457 639	919 300	9 738 471	45 561 981
Execução financeira (12) = (10) + (5)	3 281 375	2 986 592	1 437 893	1 844 582	417 361	1 587 575	51 864 524	63 419 903
Execução financeira % (13) = (12) / ((9) + (5))	10,34%	43,46%	66,87%	56,74%	47,70%	63,33%	84,19%	58,19%

(*) O pagamento da medida infraestruturas não considera o valor pago à própria entidade com vista ao processo de transição de saldos de RG

Quadro 4 – Indicadores de Execução Financeira, por medida, Relatório Anual - 2019

(um: EUR)

Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	22 233 663	16 100 000	3 630 000	1 280 000	1 000 000	1 890 000	53 180 442	99 314 105
Saldo da Gerência Anterior aplicados em despesa (2)	26 972 562		712 500	1 406 471				29 091 533
Crédito Especial de RP (3)	916 798							916 798
Transferências para as FSS (4)	1 921 697	1 352 797						3 274 494
Alterações orçamentais entre medidas (5)	-6 839 195	6 839 195	0	0	0	0	0	0
Dotação Corrigida (6) = (1) + (2) + (3) - (4) + (5)	41 362 131	21 586 398	4 342 500	2 686 471	1 000 000	1 890 000	53 180 442	126 047 942
Cativo (7)	0	2 012 500	0	0	125 000	236 250	2 497 188	4 870 938
Dotação corrigida líquida (8) = (6) - (7)	41 362 131	19 573 898	4 342 500	2 686 471	875 000	1 653 750	50 683 254	121 177 004
Pagamentos (9)	4 477 974	19 514 876	828 664	1 497 733	802 132	744 149	37 688 613	65 554 141
Saldo da medida (10) = (8) - (9)	36 884 157	59 022	3 513 836	1 188 738	72 868	909 601	12 994 641	55 622 863
Execução financeira (11) = (9) + (4)	6 399 671	20 867 673	828 664	1 497 733	802 132*	744 149**	37 688 613	68 828 635
Execução financeira % (12) = (11) / ((8) + (4))	14,79%	99,72%	19,08%	55,75%	91,67%	45,00%	74,36%	55,31%

(*) Execução financeira constante do Relatório Anual de 2019, contudo devido à reclassificação de alguns bens, deveria ter sido considerado 817.050EUR (Ver 4.5.1 e 4.3.1 do Relatório de Execução de 2020)

(**) Execução financeira constante do Relatório Anual de 2019, contudo devido à reclassificação de alguns bens, deveria ter sido considerado 729.230EUR (Ver 4.6.1 do Relatório de Execução de 2020)

Quadro 5 – Indicadores de Execução Financeira, por medida, Relatório Anual - 2020

(un: EUR)


Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	23 426 425	15 400 000	1 050 000	1 280 000	1 000 000	3 728 493	53 565 105	99 450 023
Saldos da Gerência Anterior aplicados em despesa (2)	31 050 559		2 226 464	581 864				33 858 887
Reduções de receitas de impostos para outras entidades (3)	0	212 500	0	0	125 000	466 062	6 206 615	7 010 177
Créditos Especiais de RP (4)	6 130 951						781 481	6 912 432
Transferências para as FSS no âmbito da execução da LP (5)	143 391							143 391
Alterações orçamentais entre medidas (6)	0	253 400	-253 400	0	0	0	0	0
Dotação Corrigida (7) = (1) + (2) - (3) + (4) - (5) + (6)	60 464 544	15 440 900	3 023 064	1 861 864	875 000	3 262 431	48 139 971	133 067 774
Cativo (8)	0	1 712 500	0	0	0	0	489 028	2 201 528
Dotação corrigida líquida (9) = (7) - (8)	60 464 544	13 728 400	3 023 064	1 861 864	875 000	3 262 431,0	47 650 943	130 866 246
Pagamentos (10)	4 381 883	13 711 598	1 375 371	1 156 262	289 216	1 651 356	43 602 520	66 168 205
Saldo da medida (11) = (9) - (10)	56 082 661	16 802	1 647 693	705 603	585 784	1 611 075	4 048 423	64 698 041
Execução financeira (12) = (10) + (5)	4 525 274	13 711 598	1 375 371	1 156 262	289 216	1 651 356	43 602 520	66 311 596
Execução financeira % (13) = (12) / ((9) + (5))	7,47%	99,88%	45,50%	62,10%	33,05%	50,62%	91,50%	50,62%

No Quadro e Gráfico seguinte é apresentado um resumo desde 2017 a 2020, com base nos dados dos quadros anteriores, referente às dotações iniciais, às cativações, dotações corrigidas líquidas, pagamentos, saldos apurados anualmente e a execução financeira que engloba os pagamentos e as transferências para as FSS.

Quadro 6 - Indicadores de Execução Financeira, Relatórios de Execução - 2017 a 2020

Descrição	2017	2018	2019	2020	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	90 871 485	90 871 485	99 314 105	99 450 023	380 507 098
Saldos da Gerência Anterior aplicados em despesa (2)	350 414	15 086 391	29 091 533	33 858 887	78 387 225
Reforços da LPIEFSS - Dotação Centralizada combate a incêndios e projeto Cadernos Eleitorais e projeto Modernização da SGMAI (3)	0	8 997 778	0	0	8 997 778
Credito Especial de RP (4)	0	1 922 650	916 798	6 912 432	9 751 880
Redução de receitas de impostos para outras entidades (5)				7 010 177	7 010 177
Transferências para as FSS (6)	4 644 062	2 313 424	3 274 494	143 391	10 375 371
Dotação Corrigida (7) = (1) + (2) + (3) + (4) - (5) - (6)	86 577 837	114 564 880	126 047 942	133 067 774	460 258 433
Cativo (8)	14 477 392	7 896 420	4 870 938	2 201 528	29 446 278
Dotação corrigida líquida (9) = (7) - (8)	72 100 445	106 668 460	121 177 004	130 866 246	430 812 155
Pagamentos (10)	52 948 986	61 106 479	65 554 141	66 168 205	245 777 811
Saldo (11) = (9) - (10)	19 151 459	45 561 981	55 622 863	64 698 041	185 034 344
Execução financeira (12) = (10) + (6)	57 593 048	63 419 903	68 828 635	66 311 596	256 153 182
Execução financeira % (13) = (12) / ((9) + (6))	75,05%	58,19%	55,31%	50,62%	58,06%

Gráfico 1 - Indicadores de Execução Financeira, Relatórios de Execução - 2017 a 2020

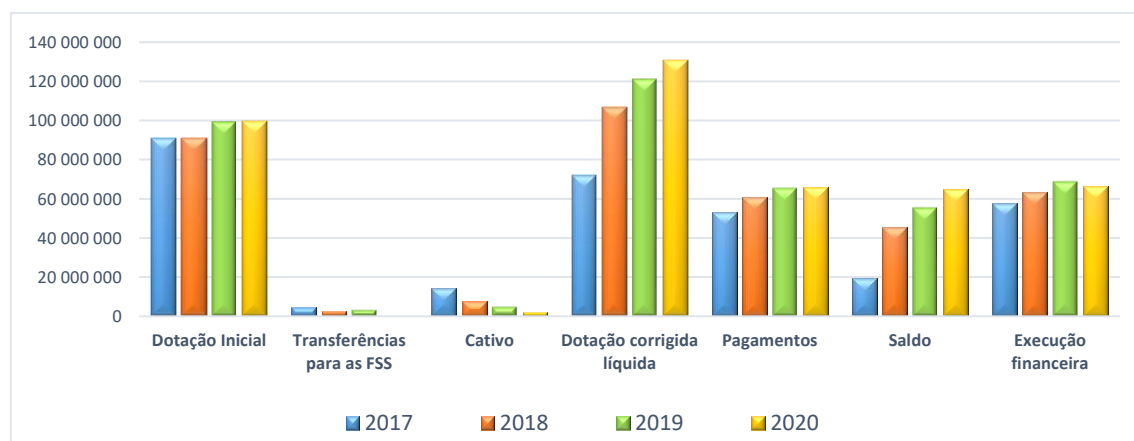

Em conclusão, com base nos quadros e gráfico anterior, podemos aferir que devido à baixa execução financeira e material da medida infraestrutura, a sua execução encontra-se ainda aquém do esperado. De qualquer forma esta medida é a que apresenta um maior hiato temporal, que poderá passar por 3 anos ou 4 anos na sua maioria, entre a decisão de autorização da intervenção numa determinada instalação e a sua efetiva conclusão, pois existe a necessidade de elaboração de um estudo prévio e o respetivo projeto de execução, prévios à contratação da empreitada, bem como a tramitação pré-contratual tanto do projeto de execução como da empreitada implicando, invariavelmente, a autorização da assunção dos encargos plurianuais.

No quadro seguinte são apresentados os indicadores de execução material da LPIEFSS, de 2017 a 2020, já com as correções refletidas em cada uma das medidas conforme consta detalhadamente no Relatório Anual de 2020.

Relativamente à execução material da medida infraestrutura devido à sua especificidade, foi apenas considerado para efeitos de apuramento o nº de empreitadas concluídas em cada ano.

Relativamente à execução material da medida STIC apenas foram consideradas as aquisições, no âmbito do projeto 10359.

Quadro 7 – Indicadores de Execução Material - 2017 a 2020

Descrição	2017	2018	2019	2020	Total
Infraestruturas - Nº de Empreitadas Concluídas	17	23	10	10	60
Veículos	48	260	677	583	1 568
Armamento	4 592	7 058	555	5 102	17 307
Equipamento de Proteção Individual	3 733	20 479	6 703	3 473	34 388
Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	2 978	3 294	8 884	3 061	18 217
Equipamento para Funções Especializadas	442	755	242	262	1 701
Equipamentos - STIC	32	1 041	13 752	14 287	29 112
Execução Material	11 842	32 910	30 823	26 778	102 353

Nos quadros seguintes apresenta-se um resumo da execução material e financeira de cada medida da LPIEFSS, por FSS, incluindo aquisições no âmbito das medidas de infraestruturas e STIC afetas à SGMAI, devido a serem transversais a mais de uma FSS, entre os anos de 2017 e 2021. Quanto a esta última medida a execução material considera apenas o projeto 10359 na medida STIC.

Quadro 8 – Quadro Resumo da Execução Material da LPIEFSS, por FSS e por anos de 2017 a 2021

FSS	Ano	Medida LPIEFSS							Total Geral
		Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	
GNR	2017	5	10	488	200	1 842	1	27	2 573
	2018	18	177	1 663	10 329	1 549	396	529	14 661
	2019	6	320	282	78	4 192	13	10 404	15 295
	2020	8	303	2 715	1 177	1 386	262	3 632	9 483
	2021	9	287	379	357	813	0	11 921	13 766
	Total GNR	46	1 097	5 527	12 141	9 782	672	26 513	55 778
PSP	2017	12	38	3 922	3 533	1 136	441	5	9 087
	2018	5	64	4 805	9 976	1 745	359	512	17 466
	2019	4	338	85	6 625	4 692	229	3 316	15 289
	2020	2	268	2 140	2 296	1 675	0	10 655	17 036
	2021	3	283	6 150	4 100	3 101	459	2 812	16 908
	Total PSP	26	991	17 102	26 530	12 349	1 488	17 300	75 786
SEF	2017		0	182	0			0	182
	2018		19	590	174			0	783
	2019		19	188	0			0	207
	2020		12	247	0			0	259
	2021		14	1 470	606			0	2090
	Total SEF		64	2 677	780			0	3521
SGMAI	2019							32	32
Total Geral		72	2 152	25 306	39 451	22 131	2 160	43 845	135 117

Quadro 9 - Quadro Resumo da Execução Financeira da LPIEFSS, por FSS e por anos de 2017 a 2021

FSS	Ano	Medida LPIEFSS							Total Geral
		Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	
GNR	2017	2 599 948 €	240 892 €	470 672 €	135 300 €	241 323 €	77 724 €	18 450 €	3 784 309 €
	2018	1 035 640 €	2 076 393 €	199 052 €	1 291 687 €	178 599 €	1 175 724 €	484 790 €	6 441 885 €
	2019	4 070 567 €	10 973 515 €	554 873 €	111 142 €	398 054 €	6 150 €	2 091 550 €	18 205 851 €
	2020	3 238 912 €	7 026 362 €	988 581 €	792 261 €	114 384 €	1 651 356 €	2 470 843 €	16 282 700 €
	2021	3 945 241 €	6 712 330 €	514 501 €	221 751 €	114 424 €	0 €	4 258 925 €	15 767 172 €
	Total GNR	14 890 308 €	27 029 492 €	2 727 679 €	2 552 142 €	1 046 784 €	2 910 954 €	9 324 558 €	60 481 917 €
PSP	2017	1 346 436 €	1 014 692 €	579 360 €	350 712 €	203 553 €	600 547 €	68 665 €	4 163 965 €
	2018	2 245 735 €	910 200 €	1 098 424 €	505 282 €	238 763 €	411 851 €	329 994 €	5 740 249 €
	2019	2 309 683 €	9 077 153 €	162 877 €	1 386 590 €	418 996 €	723 081 €	1 656 683 €	15 735 063 €
	2020	1 286 361 €	6 439 375 €	302 655 €	364 000 €	174 832 €	0 €	2 663 614 €	11 230 837 €
	2021	2 275 683 €	6 827 986 €	286 092 €	79 452 €	365 781 €	1 919 449 €	391 783 €	12 146 226 €
	Total PSP	9 463 898 €	24 269 406 €	2 429 408 €	2 686 036 €	1 401 925 €	3 654 928 €	5 110 738 €	49 016 339 €
SEF	2017		0 €	17 077 €	0 €			0 €	17 077 €
	2018		0 €	140 417 €	47 613 €			0 €	188 030 €
	2019		817 004 €	110 914 €	0 €			0 €	927 918 €
	2020		245 861 €	84 135 €	0 €			0 €	329 996 €
	2021		286 840 €	18 485 €	13 275 €			0 €	318 600 €
	Total SEF		1 349 705 €	371 028 €	60 888 €			0 €	1 781 621 €
SGMAI	2017							49 627 698 €	49 627 698 €
	2018							51 049 740 €	51 049 740 €
	2019	19 421 €						33 940 381 €	33 959 802 €
	2020							38 468 065 €	38 468 065 €
	2021							20 539 687 €	20 539 687 €
	Total SGMAI	19 421 €						193 625 571 €	193 644 992 €
Total Geral		24 373 626 €	52 648 603 €	5 528 115 €	5 299 066 €	2 448 709 €	6 565 882 €	208 060 867 €	304 924 868 €

Nos capítulos seguintes iremos analisar globalmente e detalhadamente a execução orçamental, financeira e material da LPIEFSS, em 2021.

3. *Análise Global – 2021*

3.1. Enquadramento Orçamental – Ótica da Receita

Nos termos do artigo 3.º da LPIEFSS o financiamento da mesma é assegurado por:

- a) Receitas gerais provenientes do Orçamento do Estado;
- b) 20 % da receita das forças de segurança proveniente das coimas por infrações rodoviárias prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 369/99, de 18 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro;
- c) Um terço da receita proveniente das coimas por infrações rodoviárias prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 369/99, de 18 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro;
- d) 20 % da receita das forças e serviços de segurança na taxa de segurança aeroportuária prevista na alínea a) do artigo 49.º e no n.º 1 do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 254/2012, de 28 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 108/2013, de 31 de julho;
- e) Verbas provenientes do Fundo de Garantia Automóvel para as forças de segurança, nos termos da alínea d) do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 de agosto;
- f) Receita correspondente a 90 % do valor da alienação ou de outras modalidades de rentabilização dos imóveis afetos às forças e serviços de segurança e dos imóveis anteriormente afetos aos extintos governos civis; e
- g) Outras receitas não previstas nas alíneas anteriores, designadamente as provenientes de financiamento autárquico e comunitário, nos casos aplicáveis.

As receitas de impostos do Orçamento de Estado contribuíram com cerca de 31,87% do orçamento total da LPIEFSS, conforme resulta da análise da receita cobrada líquida constante do quadro seguinte:

Quadro 10 – Indicadores de Execução Orçamental em 2021 – ótica da receita

(um: EUR)

Fonte de Financiamento	Enquadramento no artigo 3.º da LPIEFSS	Previsão Inicial	Receita Cobrada Líquida (1)	Pagamentos (2)	Saldo (1) - (2)
311 - RI não afetas a projetos cofinanciados	a) Receitas Gerais OE	66 902 226	28 992 813	28 992 813	0
522 - Saldos de Receitas Próprias	g) Saldos de RP integrados em despesa em 2021	0	38 634 718	6 719 319	31 915 399
515 - RP do ano com possibilidade de transição	f) Alienação/rentabilização de imóveis g) Outras receitas	0	3 123 922	264 762	2 859 160
541 - Transferências de RP entre Organismos	b) Coimas por infrações rodoviárias das FSS c) Coimas por infrações rodoviárias da ANSR d) Taxa de segurança aeroportuária e) Fundo de Garantia Automóvel f) Receita de Alienação de Imóveis g) Outras receitas	28 841 016	20 218 507	12 794 793	7 423 715
Total		95 743 242	90 969 961	48 771 687	42 198 274

O montante de receita arrecadada, inclui cerca de 38,6 milhões de euros referentes ao saldo da gerência de 2020 e integrados em despesa em 2021, apurados na fonte de financiamento (FF) 522 - Saldos de receitas próprias transitados, referentes apenas às medidas previstas no nº 5 do artigo 2.º da Lei nº 10/2017, de 3 de março.

Os valores pagos na FF 311 – Receitas de impostos não afetas a projetos cofinanciados, correspondem às verbas levantadas em pedidos de libertação de crédito (PLC) para suportar faturas emitidas. Não foram levantadas verbas para efeitos de transição de saldos de Receitas de Impostos.

Quadro 11 - Receitas de Transferências entre organismos, em 2021

(um: EUR)

Enquadramento no artigo 3.º da LPIEFSS	ANSR		GNR		PSP		SEF		DGTF		Total		Desvio
	Previsão Inicial	Transf. AP	Previsão Inicial	Transf. AP	Previsão Inicial	Transf. AP	Previsão Inicial	Transf. AP	Previsão Inicial	Transf. AP	Previsão Inicial	Transf. AP	
b) Coimas por infrações rodoviárias das FSS			2 436 850	2 469 429	1 607 360	1 517 949					4 044 210	3 987 379	- 56 831
c) Coimas por infrações rodoviárias da ANSR	11 000 000	9 917 897									11 000 000	9 917 897	- 1 082 103
d) Taxa de segurança aeroportuária			733 268	164 091	4 035 284	990 889	4 860 213	1 204 360			9 628 765	2 359 341	- 7 269 424
e) Fundo de Garantia Automóvel	4 000 000	3 953 890									4 000 000	3 953 890	- 46 110
f) Receita de Alienação de Imóveis									168 041	0	168 041	0	- 168 041
Total	15 000 000	13 871 788	3 170 118	2 633 520	5 642 644	2 508 839	4 860 213	1 204 360	168 041	0	28 841 016	20 218 507	- 8 622 509

Com se pode verificar no Quadro 11 as receitas arrecadadas, em 2021, provenientes da transferência entre organismos ficaram aquém do inicialmente previsto em 8.622.509 EUR.

Esta situação deveu-se maioritariamente às diversas medidas tomadas no âmbito da situação pandémica na Europa levando a uma menor circulação aérea, reduzindo drasticamente a receita proveniente da Taxa de Segurança Aeroportuária.

Deve ser salientado que as receitas provenientes da DGTf foram orçamentadas na FF 541, aquando da preparação do OE 2021. Contudo, em sede de execução do orçamento e por indicação da DGO foram cobradas como Receitas Próprias da FF 515.

Como observação ao quadro anterior, importa referir que as receitas da ANSR inscritas como previsão inicial o OE de 2021, não distinguiram a origem da mesma por alínea, nos termos do artigo 3.º da LPIEFSS. Assim, as verbas transferidas da ANSR foram recebidas como um todo, pelo que, no preenchimento do quadro optou-se por considerar todas as receitas enquadradas na alínea c) artigo 3.º da LPIEFSS.

No Quadro 12 são apresentadas detalhadamente as receitas arrecadadas, em 2021, no âmbito das alíneas a) e g) do artigo 3.º da LPIEFSS.

Quadro 12 - Receitas Impostos e receitas próprias cobradas pela SGMAI em 2021

(um: EUR)

Enquadramento no artigo 3.º da LPIEFSS	SGMAI	
	Previsão Inicial	Valor cobrado
a) Receitas provenientes do orçamento de Estado	66 902 226	28 992 813
f) Alienação/rentabilização de imóveis	0	80 298
g) Outras receitas – Restituição do IVA	0	3 043 624
Total	66 902 226	32 116 735

3.2. Execução Orçamental – Ótica da despesa

A estrutura do orçamento de investimento da SGMAI aprovada pela Lei do Orçamento de Estado, para 2021¹, no que respeita à LPIEFSS, integra o Programa Orçamental “008 - *Segurança Interna*”, sendo repartido pelas seguintes medidas, conforme maior detalhe no Quadro 13:

- 087 - *Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação;*
- 088 - *Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Infraestruturas;*
- 089 - *Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Veículos;*
- 090 - *Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Armamento;*
- 091 - *Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Equipamento de Proteção Individual;*

¹Aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro

- 092 - Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Equipamento de Apoio a Atividade Operacional;
- 093 - Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Equipamento para Funções Especializadas;
- 094 - Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Parcerias Público Privadas

O entendimento da DGO é o de que o enquadramento orçamental do projeto 9487 – Comunicações de Segurança e Emergência no orçamento de 2020, manteve-se para 2021, ou seja, manter-se-ia na medida 094 – Segurança e Ordem Pública – LPIEFSS – Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Parcerias Público Privada, ainda que o DL nº 81-A/2019, de 17 de junho, no qual a empresa passa a reger-se pelo regime jurídico aplicável às entidades do setor público empresarial após a transmissão das participações sociais da SIRESP, SA para o Estado .

Quadro 13 - Estrutura do orçamento de investimento da SGMAI, em 2021

(um: EUR)

Programa/Medida	Projeto	Designação	Fonte de Financiamento	Dotação Inicial	Medida LPIEFSS
008/087	11576	REDE DE EMERGENCIA E SEGURANÇA NACIONAL (RESN)	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	13 356 456	STIC
	9777	112.PT - FINANCIAMENTO ADICIONAL	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	1 700 000	
	10093	SALA DE SUPERVISAO E MONITORIZAÇÃO DA RNSI	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	227 550	
	10096	112.PT - INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	922 500	
	10100	LICENCIAMENTO INFORMATICO PARA A SEGURANÇA INTERNA	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	6 310 471	
	10103	GEOMAI - PROJETOS A CANDIDATAR	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	500 000	
	10143	CIBERSEGURANÇA DO MAI	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	360 000	
	10359	OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	4 314 542	
			541-Transferências de RP entre Organismos	6 435 458	
	Subtotal - 10359			10 750 000	
Subtotal Programa/Medida - 008/087				34 126 977	
008/088	10427	INFRAESTRUTURAS	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	12 087 053	Infraestruturas
			541-Transferências de RP entre Organismos	11 105 558	
	Subtotal Programa/Medida - 008/088			23 192 611	
008/089	10322	VEICULOS	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	4 200 000	Veículos
			541-Transferências de RP entre Organismos	11 300 000	
	Subtotal Programa/Medida - 008/089			15 500 000	
008/090	10317	ARMAMENTO	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	1 380 000	Armamento
008/091	10306	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	1 310 000	EPI
008/092	10316	EQUIPAMENTO DE APOIO A ATIVIDADE OPERACIONAL	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	1 000 000	EAAO
008/093	10313	EQUIPAMENTO PARA FUNÇÕES ESPECIALIZADAS	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	2 320 000	EFE
008/094	9487	COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA E EMERGENCIA	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	16 913 654	STIC
Total				95 743 242	

Como se verifica no quadro anexo à LPIEFSS as dotações de cada medida não estipulam, quais os montantes de cada uma das Fontes de Financiamento. Esta repartição é efetuada aquando da elaboração da proposta de orçamento, tendo em consideração as dotações de receitas de impostos distribuídas no âmbito do

montante atribuído ao Programa Orçamental, bem como à previsão de receitas próprias e de transferências entre Administrações Públicas inscritas em proposta de orçamento pelas entidades dadoras de receita para a LPIEFSS.

Destes condicionantes, resulta um valor inscrito na LPIEFSS para 2021 superior ao referido no quadro anexo da Lei nº 10/2017, de 3 de março. Houve ainda a necessidade de recorrer ao incremento da medida STIC para acomodar as seguintes despesas:

- a) Previsão de encargos que poderiam advir para o Estado relacionados com a gestão, manutenção, implementação e ampliação da REDE SIRESP após o termo do contrato com a SIRESP, SA, a 30 de junho de 2021. Neste sentido foi criado um projeto específico, o 11576 – Rede de Emergência e Segurança Nacional (RESN), uma vez que o DL nº 81-A/2019, de 17 de junho, determinava a celebração de um contrato de concessão a partir de 30 de junho de 2021;
- b) Acréscimo de custos com Licenciamento informático e de Outros equipamentos STIC para as FSS.

A execução orçamental da LPIEFSS, em 2021, incorpora os ajustamentos, na dotação inicial definida na LPIEFSS, decorrentes da integração dos saldos apurados na gerência anterior, conforme se pode verificar no Quadro 14:

Quadro 14 - Resumo da execução orçamental da LPIEFSS, em 2021

(Unidade: EUR)

Descrição	Valor
Dotação Inicial (1)	95 743 242
Saldos transitados (2)	38 634 718
Credito Especial de RP (3)	3 123 922
Reduções da LPIEFSS (4)	11 000 000
Dotação Corrigida (5) = (1) + (2) + (3) - (4)	126 501 882
Cativo (6)	8 624 924
Dotação corrigida líquida (7) = (5) - (6)	117 876 958
Pagamentos (8)	48 771 687
Saldo das medidas (9) = (7) - (8)	69 105 271

Apresenta-se no quadro seguinte um resumo da execução orçamental por medidas da LPIEFSS, em 2021:

Quadro 15 - Resumo da execução orçamental por medidas da LPIEFSS, em 2021

(un: EUR)

Descrição	Infraestruturas	Veículos	Armamento	EPI	EAAO	EFE	STIC	Total LPIEFSS
Dotação Inicial (1)	23 192 611	15 500 000	1 380 000	1 310 000	1 000 000	2 320 000	51 040 631	95 743 242
Saldos da Gerência Anterior aplicados em despesa (2)	37 571 421		967 168	96 129				38 634 718
Créditos Especiais de RP (3)	2 859 160	264 762						3 123 922
Reduções da LPIEFSS (4)							11 000 000	11 000 000
Alterações orçamentais entre medidas (5)	-142 995						142 995	0
Dotação Corrigida (6) = (1) + (2) + (3) - (4) + (5)	63 480 197	15 764 762	2 347 168	1 406 129	1 000 000	2 320 000	40 183 626	126 501 882
Cativo (7)		1 937 500			125 000	290 000	6 272 424	8 624 924
Dotação corrigida líquida (8) = (6) - (7)	63 480 197	13 827 262	2 347 168	1 406 129	875 000	2 030 000	33 911 202	117 876 958
Pagamentos (9)	6 220 924	13 827 158	819 078	314 478	480 205	1 919 449	25 190 395	48 771 687
Saldo da medida (10) = (8) - (9)	57 259 273	104	1 528 090	1 091 651	394 795	110 551	8 720 807	69 105 271
Execução financeira (11) = (9)	6 220 924	13 827 158	819 078	314 478	480 205	1 919 449	25 190 395	48 771 687

A diferença entre o valor da dotação inicial e o da dotação prevista na LPIEFSS para a medida de Infraestruturas, resulta das compatibilizações orçamentais entre a receita provenientes de Transferências entre Administrações Públicas (TAP's) inscritas pelas diversas entidades dadoras nos seus orçamentos como transferências para a LPIEFSS.

Os valores referentes à integração de saldos de 2020 apenas contemplam os das medidas de infraestruturas, armamento e EPI da competência do membro do Governo da Administração Interna, considerando que não foi autorizada a integração de saldos das restantes medidas pelo membro do Governo responsável pela área das Finanças.

Os créditos especiais registados referem-se à receita proveniente da restituição do IVA e da rentabilização de Imóveis MAI, cujo apuramento poderá ser consultado no Quadro 12.

Foi necessário proceder à redução de receitas de impostos da dotação inicial da LPIEFSS, no valor de 11.000.000 EUR, cuja alteração orçamental de redução (AO 0028, através da informação nº 11892/2021/SG/DSGOF, de 15 de maio) permitiu reforçar a orgânica da Entidade Coordenadora do MAI para proceder à indemnização compensatória atribuída à SIRESP, SA, prevista na RCM 59-A/2021, de 14 de maio.

A perspetiva macro e ampla fornecida pelo Quadro 15, é complementada pelo detalhe do Quadro 16 que evidencia a execução orçamental de cada medida, por projeto de investimento, com destaque para as medidas STIC e Veículos que pelas suas características plurianuais tornam a execução fluída e financeiramente previsível.

Quadro 16 - Resumo da execução orçamental por projeto da LPIEFSS, em 2021

(um: EUR)

Projeto	Dotação Inicial (1)	Dotações Corrigidas (2)	Cativos (3)	Dotação Corrigida Líquida (4) = (2) - (3)	Pagamentos (5)	Saldo da LPIEFSS (6) = (4) - (5)
9487 COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA E EMERGENCIA	16 913 654	12 826 567	0	12 826 567	12 661 101	165 466
11576 REDE DE EMERGENCIA E SEGURANÇA NACIONAL (RESN)	13 356 456	3 553 255	3 336 376	216 879	61 003	155 876
9777 112.PT - FINANCIAMENTO ADICIONAL	1 700 000	1 857 898	418 008	1 439 890	1 380 782	59 108
10093 SALA DE SUPERVISAO E MONITORIZAÇÃO DA RNSI	227 550	28 444	28 444	0	0	0
10096 112.PT - INVESTIMENTOS COMPLEMENTARES	922 500	764 602	237 087	527 515	417 050	110 465
10100 LICENCIAMENTO INFORMATICO PARA A SEGURANÇA INTERNA	6 310 471	9 542 860	788 809	8 754 051	5 521 662	3 232 389
10103 GEOMAI - PROJETOS A CANDIDATAR	500 000	697 884	74 950	622 934	498 089	124 846
10143 CIBERSEGURANÇA DO MAI	360 000	162 116	45 000	117 116	0	117 116
10359 OUTROS EQUIPAMENTOS DE TIC PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA	10 750 000	10 750 000	1 343 750	9 406 250	4 650 708	4 755 542
10427 INFRAESTRUTURAS	23 192 611	63 480 197	0	63 480 197	6 220 924	57 259 273
10322 VEICULOS	15 500 000	15 764 762	1 937 500	13 827 262	13 827 158	104
10317 ARMAMENTO	1 380 000	2 347 168	0	2 347 168	819 078	1 528 090
10306 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1 310 000	1 406 129	0	1 406 129	314 478	1 091 651
10316 EQUIPAMENTO DE APOIO A ATIVIDADE OPERACIONAL	1 000 000	1 000 000	125 000	875 000	480 205	394 795
10313 EQUIPAMENTO PARA FUNÇÕES ESPECIALIZADAS	2 320 000	2 320 000	290 000	2 030 000	1 919 449	110 551
Total	95 743 242	126 501 882	8 624 924	117 876 958	48 771 687	69 105 271

Durante o exercício orçamental, de 2021, foram realizadas duas alterações orçamentais entre medidas da LPIEFSS, cujo impacto foi globalmente neutro, e que se resumem no quadro seguinte:

Quadro 17 - Alterações orçamentais entre medidas da LPIEFSS, em 2021

(un: EUR)

Alteração Orçamental n.º	Fonte de Financiamento	Projeto	Reforço	Anulação	Total
AO38 - informação 16413/2021/SG/DSGOF/DFP, de 1 de julho	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	10100 - Licenciamento Informático para a Segurança Interna	3 375 385		3 375 385
	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	10427 - Infraestruturas		- 3 375 385	- 3 375 385
AO52 - informação 27567/2021/SG/DSGOF/DPF, de 2 de novembro	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	10427 - Infraestruturas	3 232 390		3 232 390
	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	10100 - Licenciamento Informático para a Segurança Interna		- 3 232 390	- 3 232 390
Total			6 607 775	- 6 607 775	0

Da análise ao quadro anterior verifica-se que não houve um aumento das dotações das medidas previstas no n.º 5 do artigo 3.º da Lei 10/2017 de 3 de março, verificando-se apenas o reforço do projeto 10100 da medida de STIC por contrapartida da de infraestruturas, no valor de 142.995 EUR, com vista a assegurar o compromisso referente ao contrato de licenciamento Microsoft.

3.3. Indicadores de Execução Financeira

Para efeitos da determinação da execução financeira da LPIEFSS, foram consideradas duas fórmulas de apuramento que partem da execução financeira, uma tendo por base a dotação inicial e outra a dotação corrigida líquida.

Assim, no Quadro 18, pretende-se ilustrar os indicadores de execução financeira por medida da LPIEFSS, em 2021.

Quadro 18 - Indicadores de execução financeira, em 2021

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
Infraestruturas	23 192 611	63 480 197	6 220 924	26,82%	9,80%
Veículos	15 500 000	13 827 262	13 827 158	89,21%	100,00%
Armamento	1 380 000	2 347 168	819 078	59,35%	34,90%
EPI	1 310 000	1 406 129	314 478	24,01%	22,36%
EAAO	1 000 000	875 000	480 205	48,02%	54,88%
EFE	2 320 000	2 030 000	1 919 449	82,73%	94,55%
STIC	51 040 631	33 911 202	25 190 395	49,35%	74,28%
Totais	95 743 242	117 876 958	48 771 687	50,94%	41,38%

4. Análise Detalhada

Para efeitos de planeamento, controlo e monitorização da execução da LPIEFSS, anualmente, é elaborado um Plano de Aquisições/Atividades, com vista a ser aprovado pela tutela setorial, o que ocorreu a 10 de fevereiro de 2021.

Para as medidas de Armamento, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Apoio à Atividade Operacional (EAAOp), Equipamentos para Funções Especializadas (EFE) e Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação (STIC) – Projeto 10359 – Equipamentos para as FSS, as necessidades aquisitivas planeadas são atualizadas anualmente, de acordo com as dotações disponíveis e as prioridades operacionais definidas pelas FSS.

A estratégia de aquisições plurianuais vastamente aplicada nos anos transatos da Lei, nas restantes medidas – Veículos, Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação (STIC) – restantes projetos, Infraestruturas – reflete-se na execução de 2021 e futuramente na de 2022.

Neste ponto do relatório é apresentado o detalhe da execução material e financeira da LPIEFSS, por medida, efetuando uma análise comparativa entre a execução material e os indicadores objetivos definidos aquando da criação de cada um dos projetos, ou seja, no início da LPIEFSS, bem como a análise comparativa entre a execução material e as quantidades planeadas e previstas no PA2021, considerando que estas últimas são as necessidades ajustadas às dotações disponíveis.

É ainda refletido, neste ponto do relatório, os compromissos assumidos e a assunção de responsabilidades futuras. Refira-se que todos os compromissos assumidos e responsabilidades futuras assentam em contratos celebrados com terceiros em que existe uma obrigação assumida e aceite pelas partes.

4.1. Medida Infraestruturas

Na medida de Infraestruturas, a estratégia de contratação dos projetos de execução assenta no princípio de aquisições plurianuais, contudo, a especificidade do objeto de cada contrato obriga também a uma criteriosa definição das prioridades.


Assim foram identificadas as infraestruturas com necessidades prioritárias, contratualizando-se ou iniciando-se os diversos projetos de execução e aquisição dos demais estudos e serviços necessários ao lançamento das empreitadas.

Neste sentido, a execução desta medida tem assumido um carácter plurianual, quer pelas características das intervenções, ao nível da sua complexidade e dimensão, quer também pelas vicissitudes associadas ao desenvolvimento de empreitadas, onde se pode incluir a imperatividade de trabalhos complementares e a formalização de ligação a diversos serviços que podem, de forma alheia, causar a transição para os anos seguintes da data de conclusão de diversos investimentos.

4.1.1. Medida Infraestruturas – Execução Financeira

Apresenta-se no Gráfico 2 um resumo dos investimentos efetuados, na medida de infraestruturas, desde 2017.

Gráfico 2 - Execução financeira da medida Infraestruturas, no período 2017-2021

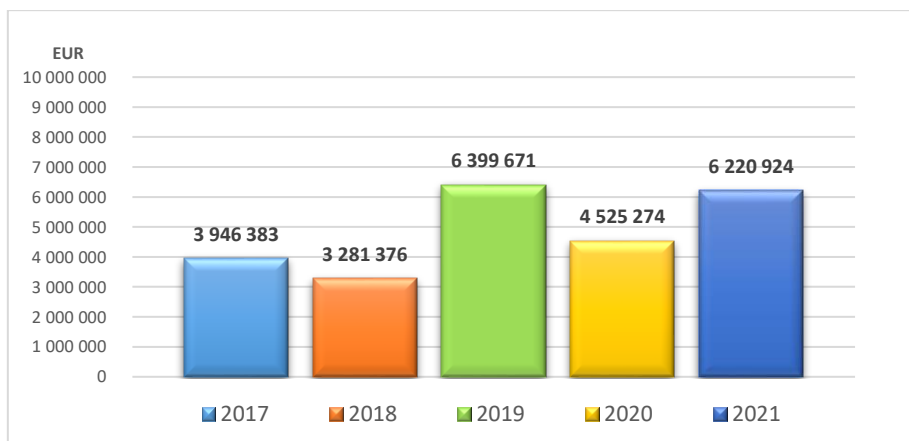

A execução financeira da presente medida resulta de um conjunto de intervenções em instalações e infraestruturas da PSP e GNR, refletidas numa execução financeira total do quinquénio de 24.373.628 EUR, e de 6.220.924 EUR, em 2021.

Na medida Infraestruturas destaca-se a complexidade e morosidade ao nível da tramitação e execução contratual, cada intervenção pressupõe pelo menos três contratos, um prévio à empreitada referente à aquisição do projeto de execução, e dois o da aquisição da empreitada e o dos serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra, ambos com execução simultânea. Este é um dos motivos da baixa execução financeira desta medida em 2021, de 9,80% em relação à dotação corrigida líquida, conforme se pode verificar no Quadro 19.

Quadro 19 - Execução Financeira da Medida Infraestruturas, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
Infraestruturas	23 192 611	63 480 197	6 220 924	26,82%	9,80%


Os investimentos realizados em 2021 e os compromissos e encargos a assumir decorrentes dos procedimentos referidos, encontram-se detalhados na Tabela 1 do Anexo I – Medida Infraestruturas, ao presente relatório.

4.1.2. Medida Infraestruturas – Execução Material

A execução da medida Infraestruturas tem como indicador de execução material, o número de empreitadas concluídas.

Apresenta-se no Gráfico 3 a execução material, na medida de infraestruturas, tendo em consideração o número de empreitadas concluídas, desde 2017.

Gráfico 3 - Execução material da medida Infraestruturas, no período 2017-2021

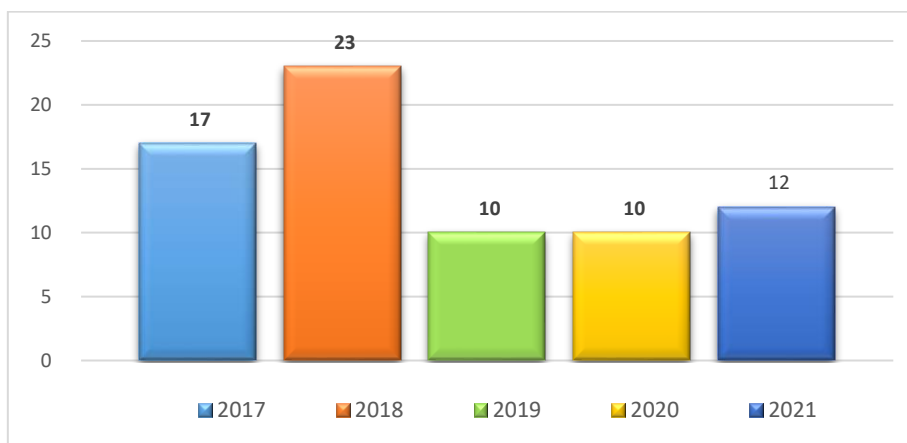


Para a persecução dos objetivos definidos para a medida Infraestruturas, foram realizados pela SGMAI diversos procedimentos no âmbito de concursos públicos e celebrados Contratos de Cooperação Interadministrativos com diversos Municípios, para assegurar as respetivas empreitadas e os serviços de fiscalização e coordenação de obra, contudo apenas se conseguiu concluir, em 2021, entre instalações da GNR e da PSP, 12 empreitadas.

Para além dos Contratos de Cooperação Interadministrativos celebrados, têm sido celebrados também Protocolos de Colaboração para assegurar a elaboração dos respetivos Projetos de Execução ou apenas para a cedência de terrenos ou imóveis.

Este indicador na LPIEFSS tinha como objetivo definido para 2021 a conclusão de 43 empreitadas, das quais 22 seriam em instalações da GNR e 21 em instalações da PSP.

Por forma a evidenciar a execução material da LPIEFSS em 2021, apresenta-se no Gráfico 4 um resumo do número de empreitadas concluídas, bem como a comparação entre o indicador objetivo definido, para o ano de 2021, e a respetiva execução material, por FSS:

Gráfico 4 - Execução material da medida Infraestruturas vs Indicador Objetivo, por FSS

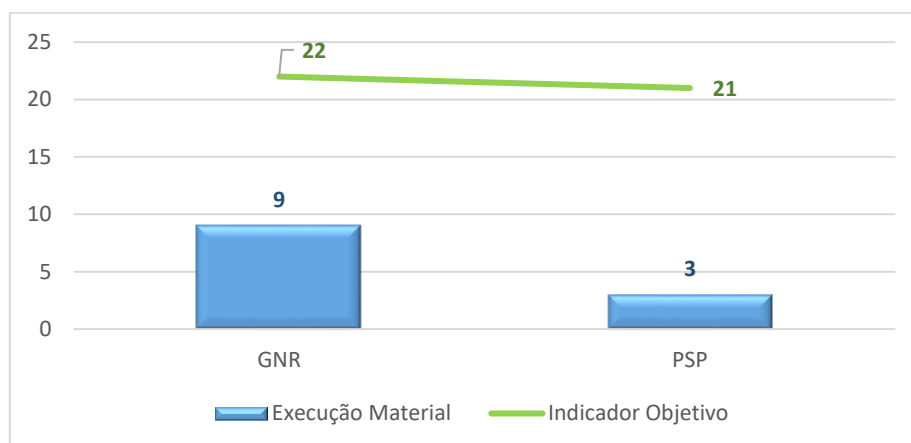

O detalhe das empreitadas concluídas, em 2021, que contribuem para a execução material desta medida encontra-se no Quadro 20:

Quadro 20 – Detalhe da Execução Material da Medida Infraestruturas, em 2021

FSS	INSTALAÇÕES	TIPO DE INTERVENÇÃO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
GNR	BARRANCOS – PTER da GNR	Remodelação de Edifício	NÃO
	BRAGANÇA – GIPS	Demolições das instalações antigas	NÃO
	COSTA DA CAPARICA – PTER da GNR	Substituição da cobertura e reparações diversas	NÃO
	CUCUJÃES – PTER da GNR	Reabilitação de imóvel	SIM
	LAGOS - PTER da GNR	Reabilitação e adaptação de edifício	SIM
	LIVRAMENTO - PTER da GNR	Reabilitação	SIM
	MEDAS - PTER da GNR	Remodelação de Imóvel	SIM
	MONDIM DE BASTO- PTER da GNR	Remodelação de Imóvel	SIM
	SERPA – PTER da GNR	Reabilitação/Ampliação	NÃO
PSP	ELVAS – Divisão Policial	Reabilitação do edifício	NÃO
	LEIRIA – Comando Distrital da PSP	Contenção de deformação em paredes exteriores	NÃO
	VALONGO - Esquadra da PSP	Requalificação	SIM

4.1.3. Medida Infraestruturas – Compromissos Assumidos, para 2021

Os contratos plurianuais em vigor, incluindo os Contratos Interadministrativos e Protocolos, celebrados em 2021 e em anos anteriores, que culminarão na conclusão, expetável, de 120 empreitadas, tendo em conta os projetos de execução em desenvolvimento.

Os encargos já assumidos apenas com as empreitadas, quer sejam desenvolvidas pela SGMAI quer sejam através de Contratos Interadministrativos, preveem encargos para o ano de 2022 no valor de 24.458.182EUR, e no valor total de 7.634.753 EUR para os anos seguintes, conforme se demonstra no Quadro 21:

Quadro 21 - Compromissos Futuros Assumidos em Anos Anteriores na Medida Infraestruturas

FSS	Projetos de Execução				Empreitadas				Fiscalização e CSO				Outros Serviços			
	Nº	Encargos assumidos* (EUR)			Nº	Encargos assumidos* (EUR)			Nº	Encargos Assumidos* (EUR)			Nº	Encargos Assumidos* (EUR)		
		2022	2023	2024 e seguintes		2022	2023	2024 e seguintes		2022	2023	2024 e seguintes		2022	2023	2024 e seguintes
GNR	34	1 197 152	1 601 067	226 956	25	11 424 920	2 796 170	0	9	427 418	162 573	1	1	3 690	0	0
PSP	34	1 248 610	264 071	44 469	17	13 033 262	4 142 205	696 378	7	169 245	91 598	91 242	0	0	0	0
Total	68	2 445 762	1 865 138	271 425	42	24 458 182	6 938 375	696 378	16	596 663	254 171	91 243	1	3 690	0	0

Será ainda importante referir que dos 68 projetos de execução, 17 correspondem a Protocolos de Colaboração celebrados, entre o MAI e diversas Câmaras Municipais, dos quais 16 são respeitantes a instalações da GNR e 1 da PSP.

Para além dos Protocolos de Colaboração acima referidos, existem ainda 41 Protocolos de Colaboração para a elaboração do estudo prévio e do projeto de execução ou apenas para cedência de imóvel ou terreno. Dos quais 29 correspondem a instalações da GNR e 12 da PSP que, após a aprovação dos projetos de execução, resultará a celebração dos respetivos Contratos de Cooperação Interadministrativos, para assegurar as respetivas obras.

Estão ainda previstos lançar ao mercado em 2022, a aquisição de 9 projetos de execução para a PSP, 3 empreitadas para a GNR e 1 para a PSP, cujos encargos ainda não constam no Quadro 21 considerando que não foram registados encargos plurianuais em 2021.

Será ainda importante referir que, para além dos encargos já apurados para 2022 (27.504.297 EUR) resultantes dos compromissos assumidos em anos anteriores, conforme Quadro 21, o volume de despesa a realizar no presente ano económico será superior a este montante, porquanto incluirá igualmente a despesa ainda a assumir, em 2022, resultante das intervenções planeadas e previstas no PA2021 no âmbito da LPIEFSS.

4.2. Medida Veículos


Na medida Veículos destaca-se a adjudicação de diversos procedimentos de contratação plurianuais sendo de sublinhar que, encontram-se em execução material e financeira 25 (vinte e cinco) contratos plurianuais correspondendo a 42 lotes, nos quais constam as quantidades de veículos a entregar anualmente, até ao final de 2021.

Em 2018 iniciaram-se as entregas referentes aos 17 contratos celebrados, no âmbito do procedimento pré-contratual nº 177/DSUMC/17. Em 2019 iniciaram-se as entregas referentes aos 11 contratos celebrados, no âmbito dos procedimentos pré-contratuais nº 55/DPIE/18 e nº 99/DPIE/18, referentes aos lotes que ficaram desertos no procedimento suprarreferido.

4.2.1. Medida Veículos – Execução Financeira

Os investimentos efetuados, desde 2017, na medida de veículos, encontram-se resumidos no Gráfico 5:

Gráfico 5 - Execução financeira da medida Veículos, no período 2017-2021

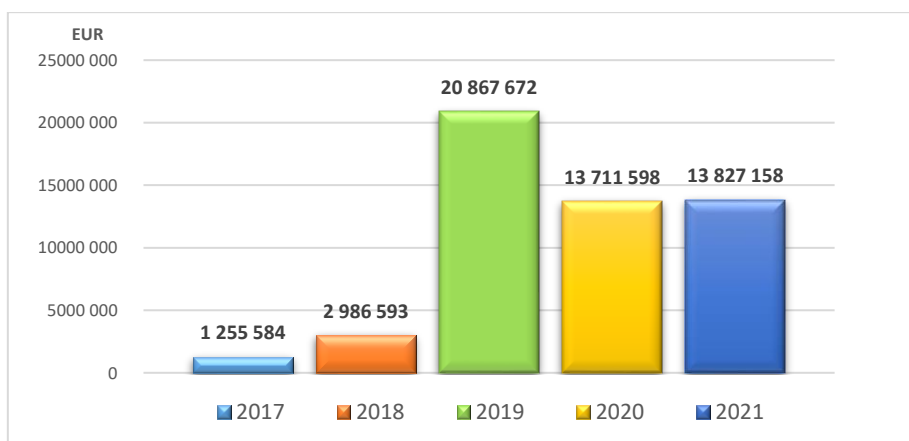

A execução financeira da medida de veículos resulta maioritariamente de uma estratégia plurianual de execução para todo o horizonte temporal da LPIEFSS, através do lançamento de processos aquisitivos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap), que é a entidade gestora do Parque de Veículos do Estado, com competência para a tramitação pré-contratual de procedimentos aquisitivos no âmbito dos veículos. Estes procedimentos deram origem a encargos e compromissos assumidos para os anos de 2018 a 2021.

No Quadro 22 é possível verificar que esta medida teve em 2021 uma execução financeira de 100%, em relação à dotação corrigida, o que se deve ao facto dos contratos terem sido celebrados em anos anteriores prevendo entregas plurianuais, conforme já referido anteriormente.

Quadro 22 - Execução Financeira da Medida Veículos, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
Veículos	15 500 000	13 827 262	13 827 158	89,21%	100%


(*) Dotação constante do "Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança" publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março.

Os investimentos realizados em 2021 encontram-se detalhados no Anexo II – Medida Veículos.

4.2.2. Medida Veículos – Execução Material

No Gráfico 6 apresenta-se um resumo da execução material, da medida de veículos da LPIEFSS, desde 2017:

Gráfico 6 - Execução material da medida Veículos, no período 2017-2021

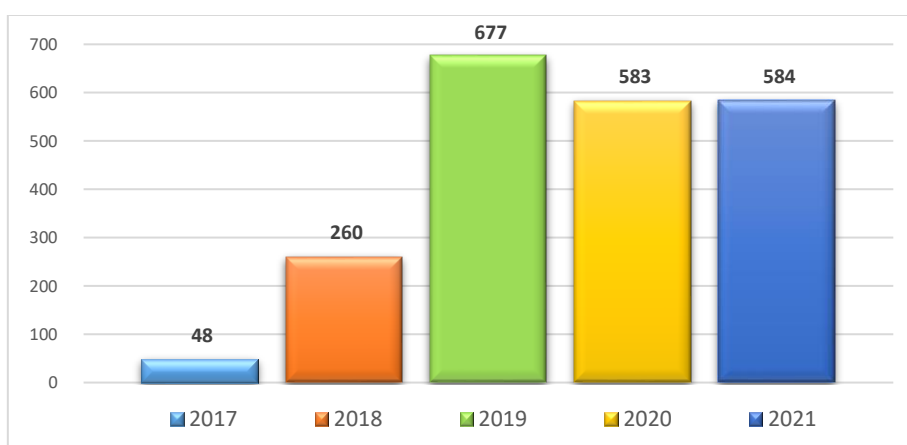


A medida Veículos ao longo do quinquénio teve uma execução material de 2.152 veículos.

O indicador objetivo de execução material, definido na LPIEFSS, para esta medida foi o número de viaturas adquiridas. Este indicador para o ano de 2021, tinha por objetivo, a aquisição de 759 viaturas, em resultado da contratação plurianual foi possível contratualizar a entrega de 584 veículos, conforme gráfico anterior.

Assim, por forma a evidenciar a execução material por FSS, da medida de veículos da LPIEFSS em 2021, bem como a comparação entre o indicador objetivo definido e a respetiva execução material, apresenta-se o Gráfico 7:


Gráfico 7 - Execução material da medida Veículos vs Indicador Objetivo, por FSS

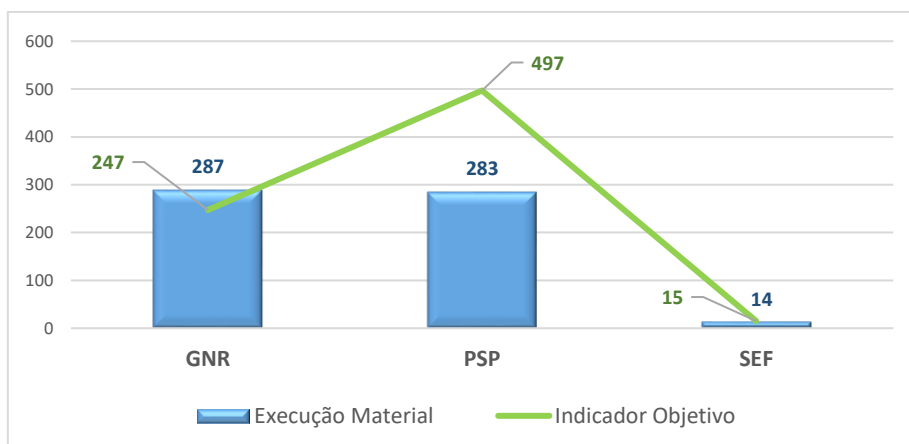

Como se pode verificar, no Gráfico 7, durante o ano de 2021 foram entregues às FSS 584 veículos, destes 287 à GNR quando o indicador objetivo tinha sido definido de 247 veículos. Quanto à PSP este indicador objetivo tinha definido 497 veículos, contudo, em 2017 e 2018 apenas foi contratualizada para o ano de 2021 a entrega de 283 veículos.

Os veículos entregues a estas FS são maioritariamente destinados ao patrulhamento e fiscalização rodoviária. Relativamente ao SEF o indicador objetivo tinha sido definido inicialmente com a entrega 15 veículos, contudo os diversos contratos celebrados em 2017 e 2018, previam a entrega de 14 veículos durante o ano de 2021. No caso deste Serviço de Segurança os veículos entregues são na sua totalidade destinados à investigação criminal.

Gráfico 8 - Execução material da medida Veículos vs Quantidades previstas PA2021, por FSS

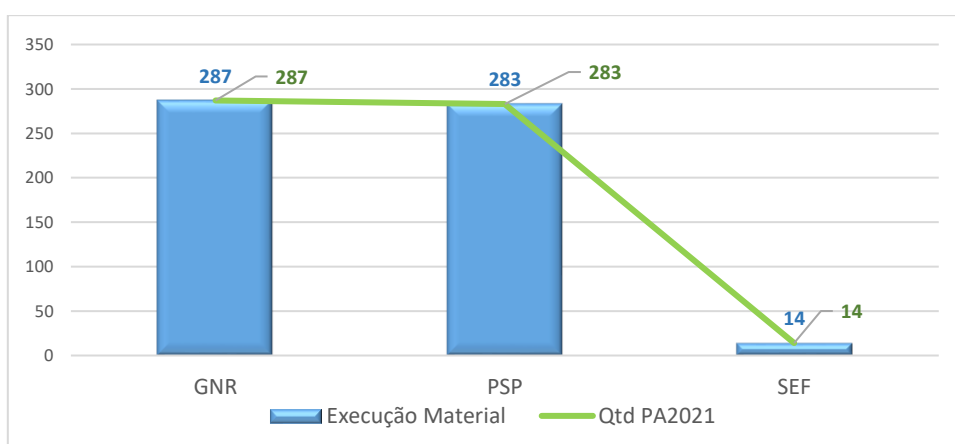

Através do gráfico anterior podemos verificar que a execução material foi de 100% em relação ao planeado e previsto no PA2021, para todas as FSS.

4.3. Medida Armamento


Na medida Armamento destaca-se a vigência de alguns contratos, celebrados em 2019, com execução plurianual e entregas previstas, para os anos de 2019 a 2021.

A execução em 2021, foi muito condicionada pelos dilatados prazos de entrega do material decorrente da forte regulação, nacional e internacional, neste setor, bem como pela situação pandémica que o País e o mundo atravessaram e continuam a atravessar, considerando que os bens adquiridos nesta medida, na sua maioria têm origem em países estrangeiros, de fabrico Europeu ou mesmo fora da Europa.

4.3.1. Medida Armamento – Execução Financeira

Os investimentos efetuados, desde 2017, bem como, dos compromissos plurianuais assumidos em 2020, para o ano de 2021, da medida de armamento, encontram-se resumidos no Gráfico 9:

Gráfico 9 - Execução financeira da medida Armamento, no período 2017-2021

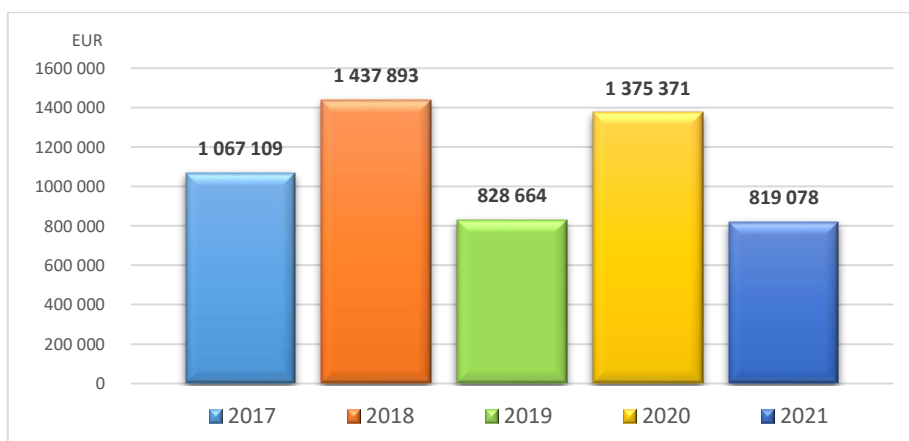

No Gráfico anterior é possível verificar que as entregas de bens efetuadas na medida Armamento, durante o quinquénio, originaram um encargo total de 5.528.115 EUR, correspondendo a um encargo de 819.078 EUR, em 2021.

No Quadro 23 é possível verificar que esta medida teve em 2021 uma execução financeira de 34,90%, em relação à dotação corrigida líquida, o que se deve, por um lado, à possibilidade de utilização do saldo transitado de anos anteriores e por outro ao lançamento de novos procedimentos em 2021 ficarem condicionados aos dilatados prazos de entrega do material decorrente da forte regulação, nacional e internacional, conforme já referido anteriormente.

Quadro 23 - Execução Financeira da Medida Armamento, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
Armamento	1 380 000	2 347 168	819 078	59,35%	34,90%


(*) Dotação constante do "Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança" publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março.

Os investimentos realizados em 2021 encontram-se detalhados no Anexo III – Medida Armamento, ao presente relatório.

4.3.2. Medida Armamento – Execução Material

No Gráfico 10, apresenta-se um resumo da execução material, da medida armamento da LPIEFSS, desde 2017:


Gráfico 10 - Execução material da medida Armamento, no período 2017-2021

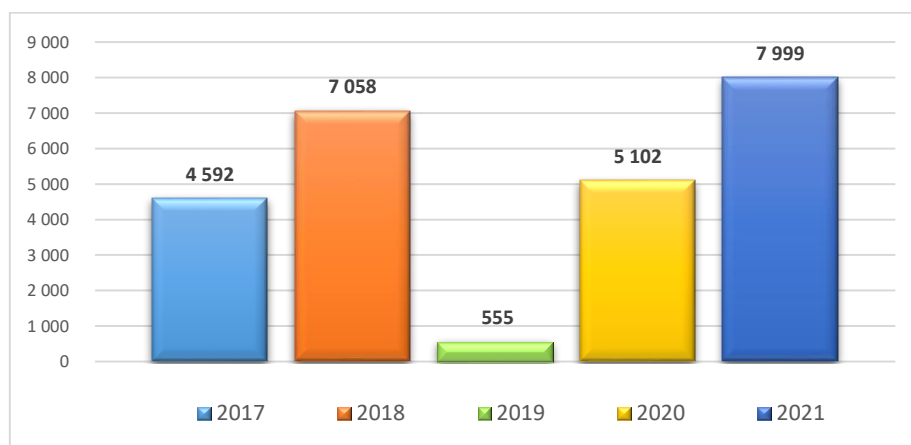

Através do Gráfico anterior podemos verificar que, durante o quinquénio, foram entregues um total 25.306 bens entre eles armas e acessórios para armamento.

Por forma a evidenciar a execução material por FSS, da medida Armamento da LPIEFSS em 2021, apresenta-se o Gráfico 11:

Gráfico 11 - Execução material da medida Armamento, por FSS, em 2021

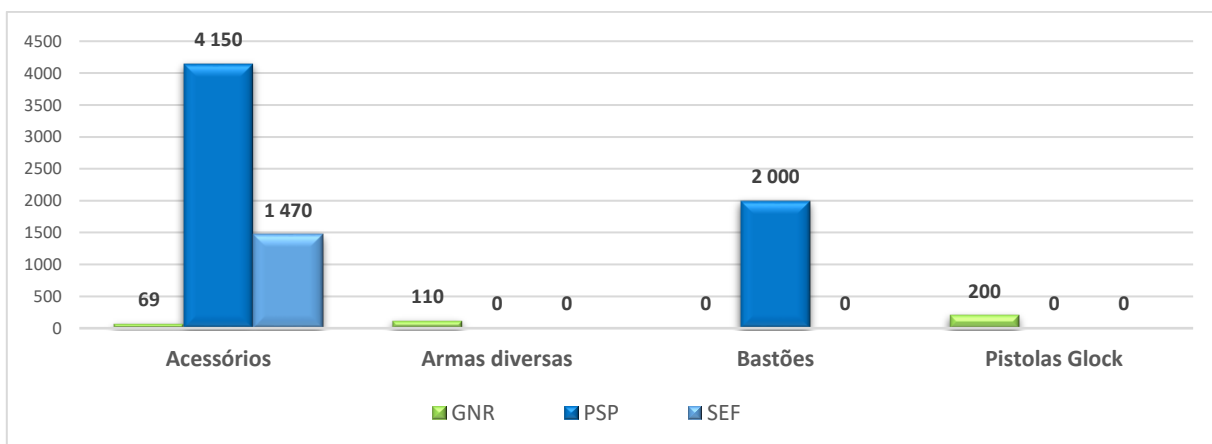

A execução material da medida armamento tem como indicador de execução, o número de armas e de acessórios adquiridos.

O indicador para 2021, tem como objetivo, a aquisição de 1.016 armas e 573 acessórios. Em resultado da contratação plurianual e dos procedimentos aquisitivos lançados, em 2021, foi possível a entrega de 2.310 armas e de 5.689 acessórios.

No Gráfico 12 e Gráfico 13 apresenta-se a comparação entre os indicadores objetivos para a aquisição de armas e de acessórios, para o ano de 2021, e a respetiva execução material.

Gráfico 12 - Execução material da medida Armamento vs Indicador Objetivo (Armas), em 2021




Gráfico 13 - Execução material da medida Armamento vs Indicador Objetivo (Acessórios), em 2021





Gráfico 14 - Execução material da medida Armamento vs Quantidades previstas PA2021, por FSS

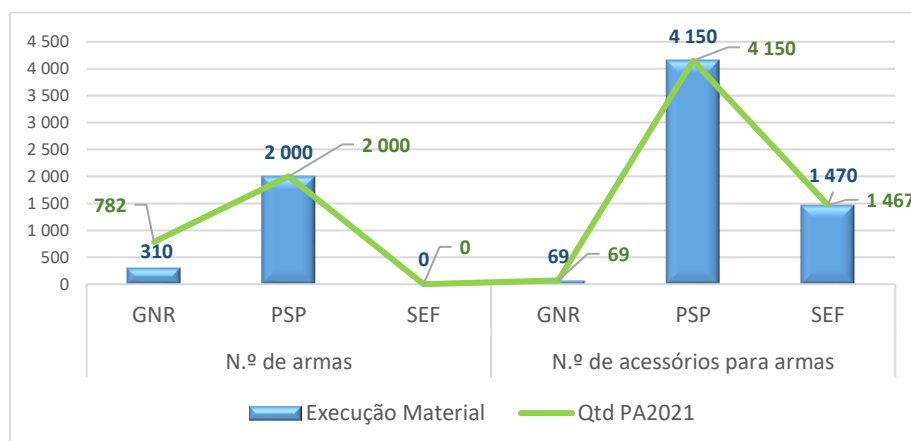

Através do gráfico anterior podemos verificar que apenas não foi possível ter execução material de 472 armas, para a GNR, em relação ao planeado e previsto no PA2021, devido aos constrangimentos referidos anteriormente. Se tivermos em conta a execução material (7.999 bens) em relação às quantidades de bens a adquirir previstas no PA2021 (8.468 bens), podemos concluir que no ano de 2021 a execução material foi de 94,46%.


4.4. Medida Equipamento de Proteção Individual

Na medida EPI destaca-se a adjudicação de diversos procedimentos de contratação, sendo de sublinhar os compromissos assumidos em anos anteriores que tiveram impacto em 2021.

4.4.1. Medida Equipamento de Proteção Individual – Execução Financeira

Os investimentos efetuados, desde 2017, na medida de equipamento de proteção individual, encontram-se resumidos no Gráfico 15:

Gráfico 15 - Execução financeira da medida EPI, no período 2017-2021

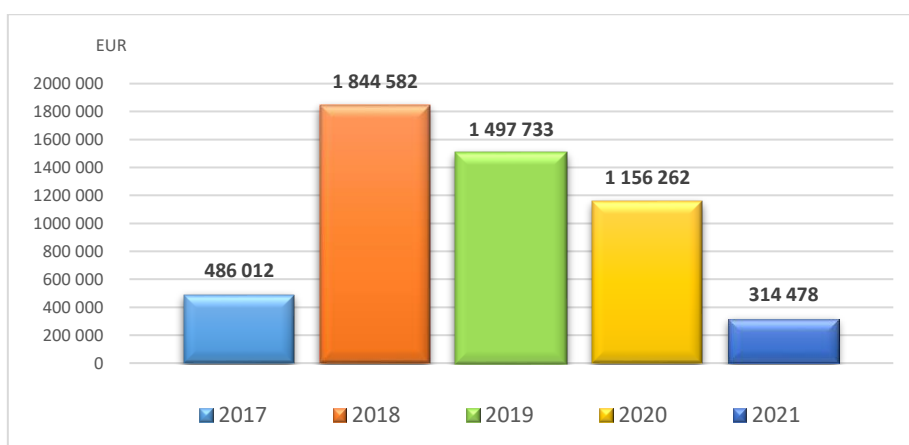

No Gráfico anterior é possível verificar que a entrega de equipamentos de proteção individual efetuada, durante o quinquénio, originou um encargo total de 5.299.066 EUR.

No Quadro 24 é possível verificar que esta medida teve em 2021 uma execução financeira de 314.478 EUR, correspondendo a uma execução de 22,36% em relação à dotação corrigida. Tal resultado deve-se à integração do saldo transitado de anos anteriores bem como ao lançamento de novos procedimentos em 2021 condicionados aos dilatados prazos de entrega, em especial do equipamento de proteção balística, decorrente da forte regulação, nacional e internacional.

Quadro 24 - Execução Financeira da Medida EPI, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
EPI	1 310 000	1 406 129	314 478	24,01%	22,36%


(*) Dotação constante do "Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança" publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março.

Os investimentos realizados em 2021, encontram-se detalhados na Tabela 4, constante do Anexo IV – Medida EPI, ao presente relatório.

4.4.2. Medida Equipamento de Proteção Individual – Execução Material

No Gráfico 16, apresenta-se um resumo da execução material, da medida equipamento de proteção individual da LPIEFSS, desde 2017:


Gráfico 16 - Execução material da medida EPI, no período 2017-2021

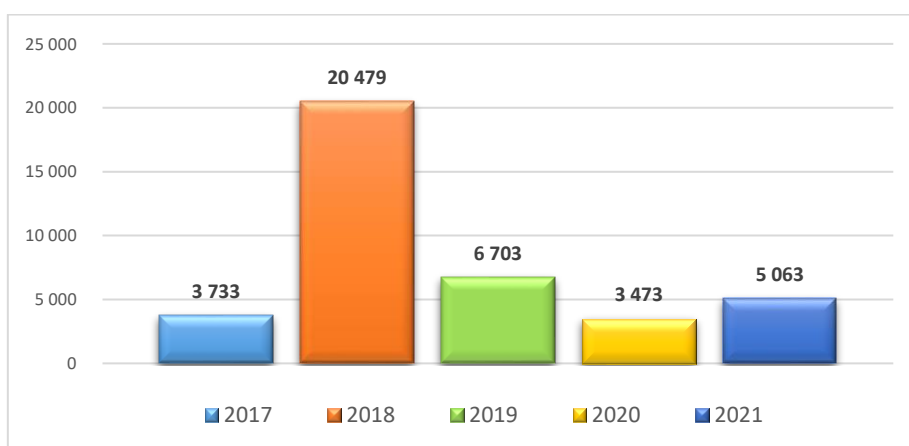

No Gráfico anterior podemos verificar que, durante o quinquénio, foram entregues um total 39.451 equipamentos de proteção individual, entre eles equipamentos de proteção balística e outros equipamentos de proteção individual.

Por forma a evidenciar a execução material da medida EPI da LPIEFSS, em 2021, apresenta-se no Gráfico 17 um resumo dos coletes balísticos e outros equipamentos de proteção individual entregues:

Gráfico 17 - Execução material da medida EPI, por FSS, em 2021

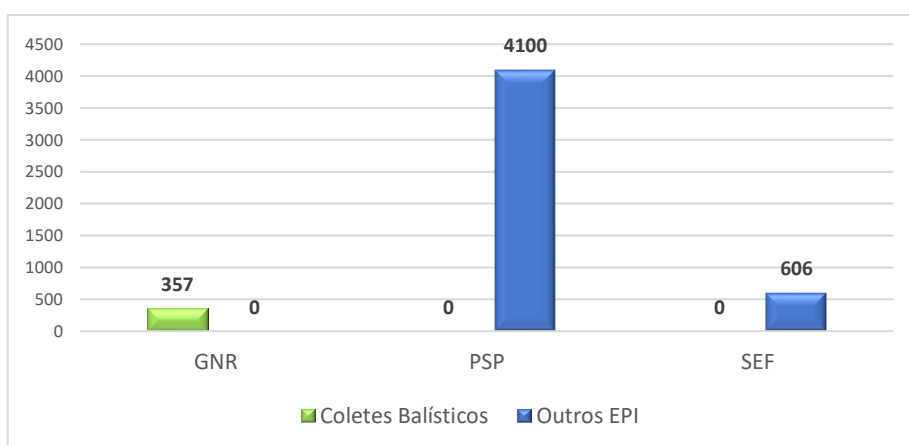

O indicador objetivo de execução material, definido na LPIEFSS, para esta medida foi o número de coletes balísticos e de outros EPI adquiridos.

Este indicador na LPIEFSS, para 2021, tinha por objetivo, a aquisição de 621 coletes balísticos e de 10.878 de outros EPI. Em resultado da contratação plurianual foi possível a entrega de 357 coletes balísticos e relativamente à aquisição de outros equipamentos de proteção individual foi possível contratualizar e entregar 4.706 equipamentos de proteção individual.

No Gráfico 18 e Gráfico 19 apresenta-se a comparação entre os indicadores objetivos para o ano de 2021, e a respetiva execução material.

Gráfico 18 - Execução material da medida EPI vs Indicador Objetivo (Coletes Balísticos), em 2021

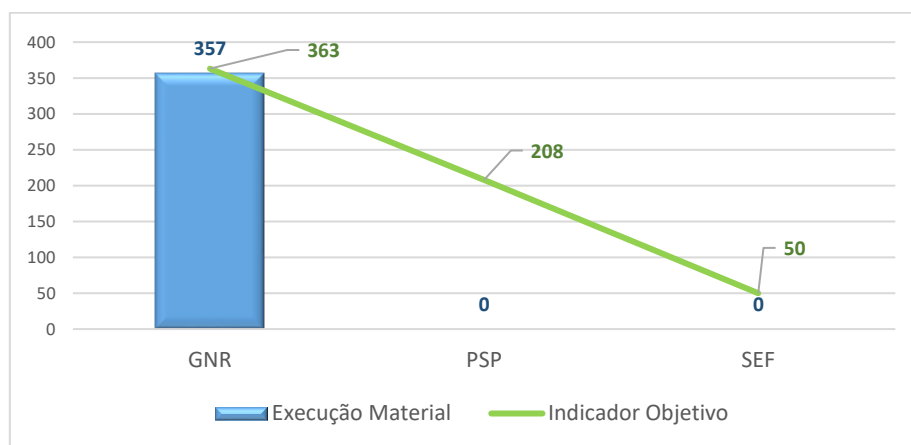


Gráfico 19 - Execução material da medida EPI vs Indicador Objetivo (Outros EPI), em 2021


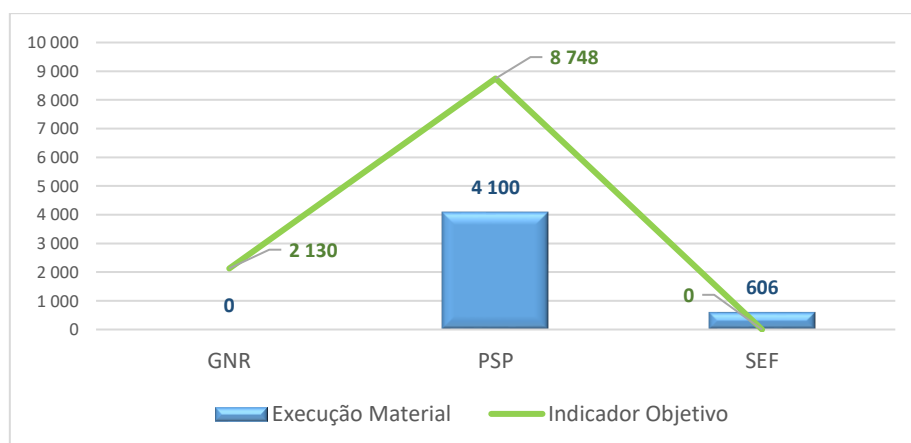


Gráfico 20 - Execução material da medida EPI vs Quantidades previstas PA2021, por FSS

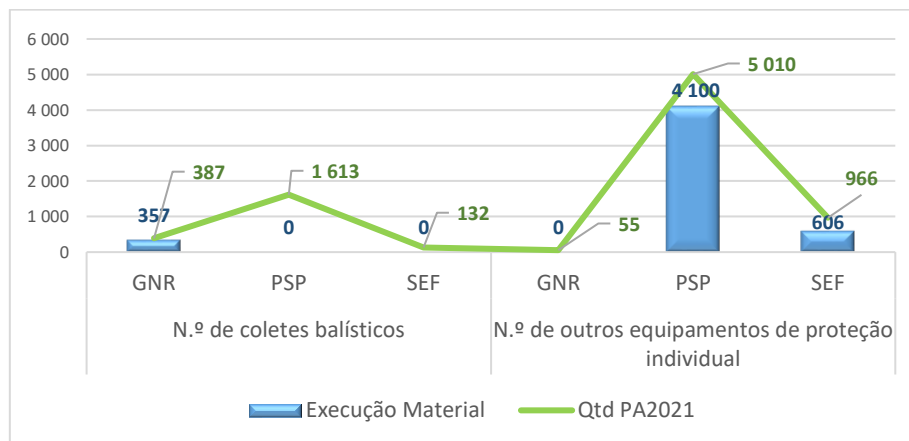

Através do gráfico anterior podemos verificar que não foi possível ter execução material de 3.100 bens, dos quais 2.725 eram referentes a bens de proteção balística, em relação ao planeado e previsto no PA2021, devido aos constrangimentos referidos anteriormente. Se tivermos em conta a execução material (5.063 bens) em relação às quantidades de bens a adquirir previstas no PA2021 (8.163 bens), podemos concluir que no ano de 2021 a execução material foi de 62,02%.


4.5. Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional

Na medida EAAO destaca-se a adjudicação de diversos procedimentos aquisitivos maioritariamente para assegurar o mobiliário de diversas instalações previstas na medida Infraestruturas o que implica que a aquisição e a entrega do respetivo mobiliário esteja sincronizada com a conclusão da empreitada.

4.5.1. Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional – Execução Financeira

Os investimentos efetuados, desde 2017, na medida de equipamento de apoio à atividade operacional, encontram-se resumidos no Gráfico 21:

Gráfico 21 - Execução financeira da medida EAAOp, no período 2017-2021

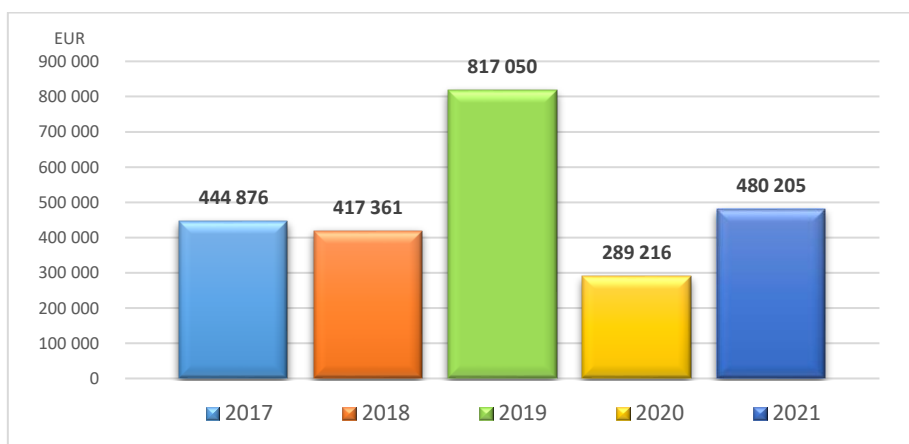

No Gráfico anterior é possível verificar que a entrega de bens efetuada, durante o quinquénio, originou um encargo total de 2.448.709 EUR.

No Quadro 25 é possível verificar que esta medida teve em 2021 uma execução financeira de 480.205 EUR correspondente a 54,88%, em relação à dotação corrigida.

Quadro 25 - Execução Financeira da Medida EAAOp, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
EAAO	1 000 000	875 000	480 205	48,02%	54,88%


(*) Dotação constante do "Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança" publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março.

Os investimentos realizados em 2021 na medida EAAOp, encontram-se detalhados no Anexo V – Medida EAAOp, ao presente relatório.

4.5.2. Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional – Execução Material

No Gráfico 22, apresenta-se um resumo da execução material, da medida EAAOp da LPIEFSS, desde 2017:

Gráfico 22 - Execução material da medida EAAOp, no período 2017-2021

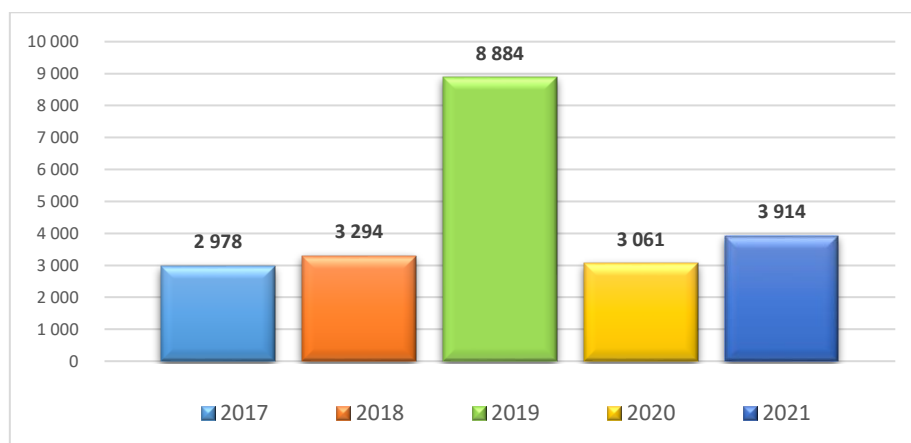

No Gráfico anterior podemos verificar que, durante o quinquénio, foram entregues um total 22.131 bens, maioritariamente mobiliário para equipar as diversas instalações com intervenções previstas na LPIEFSS (Medida Infraestruturas).

O indicador objetivo de execução material, definido na LPIEFSS, para esta medida foi o número de equipamentos adquiridos para a GNR e para a PSP.

Este indicador na LPIEFSS, para 2021, tinha por objetivo, a aquisição de 2.577 artigos de mobiliário para a GNR e 2.423 para a PSP, perfazendo um total de 5.000 artigos, contudo devido às fábricas não estarem a laborar a 100%, devido à situação pandémica, das necessidades aquisitivas demonstradas e contratualizadas apenas foi possível a entrega de 3.914 artigos, 813 para a GNR e 3.101 para a PSP.

Assim, por forma a evidenciar a execução material por FSS, da medida de EAAOp da LPIEFSS em 2021, bem como a comparação entre os indicadores objetivos e a respetiva execução material, apresenta-se o Gráfico 23:

Gráfico 23 - Execução material da medida EAAOp vs Indicador Objetivo, por FSS, em 2021


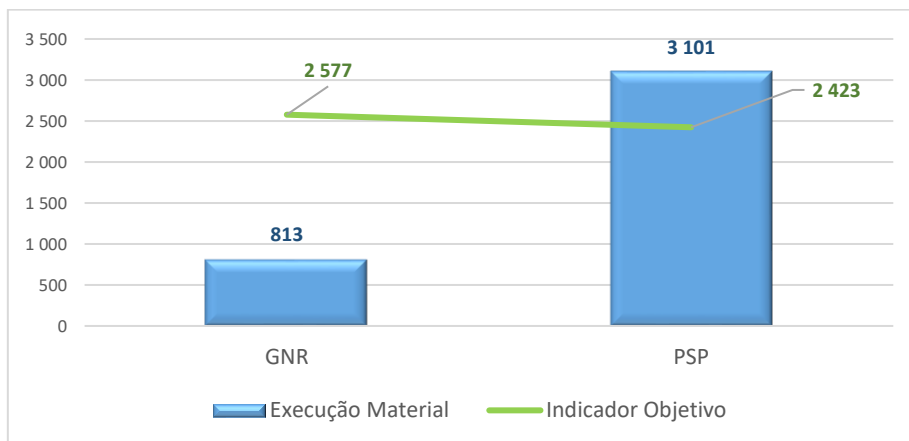


Gráfico 24 - Execução material da medida EAAOp vs Quantidades previstas PA2021, por FSS

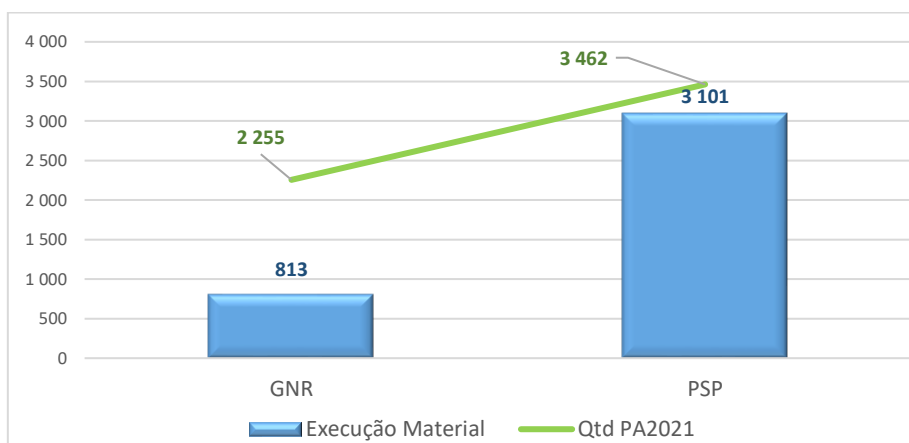

Através do gráfico anterior podemos verificar que não foi possível ter execução material de 1.803 bens, em relação ao planeado e previsto no PA2021, dos quais 1.420 referentes a bens para dotar os centros de formação de Portalegre, da Figueira da Foz e da Escola da Guarda. Também houve a necessidade reajustar algumas quantidades, revendo-as em baixa devido ao aumento dos preços unitários desta tipologia de bens, face à sua escassez e ao aumento de preços das matérias primas. Se tivermos em conta a execução material (3.914 bens) em relação às quantidades de bens a adquirir previstas no PA2021 (5.717 bens), podemos concluir que no ano de 2021 a execução material foi de 68,46%.

4.5.3. Medida Equipamento de Apoio à Atividade Operacional – Compromissos Assumidos para 2022

Será ainda importante referir que, devido à impossibilidade da entrega total dos bens adquiridos no âmbito de contratos celebrados em 2021, alguns contratos irão ter encargos plurianuais em 2022, no valor total de 33.534 EUR, conforme o Quadro 26.

Quadro 26 - Compromissos assumidos em anos anteriores, na Medida EAAOp, para 2022

FS	Nº de Equipamentos previstos entregar em 2022	Encargos Assumidos para 2022 (EUR)
GNR	22	1 661
PSP	26	31 873
Total	48	33 534


4.6. Medida Equipamento para Funções Especializadas

A medida EFE tem como objetivo a aquisição de equipamentos para modernizar e normalizar os equipamentos operacionais afetos a funções especializadas (trânsito, investigação criminal, ordem pública, inativação de engenhos explosivos, proteção da natureza, controlo costeiro, missões internacionais, entre outras).

4.6.1. Medida Equipamento para Funções Especializadas – Execução Financeira

Os investimentos efetuados, desde 2017, na medida de equipamento para funções especializadas, encontram-se resumidos no Gráfico 25:

Gráfico 25 - Execução financeira da medida EFE, no período 2017-2021

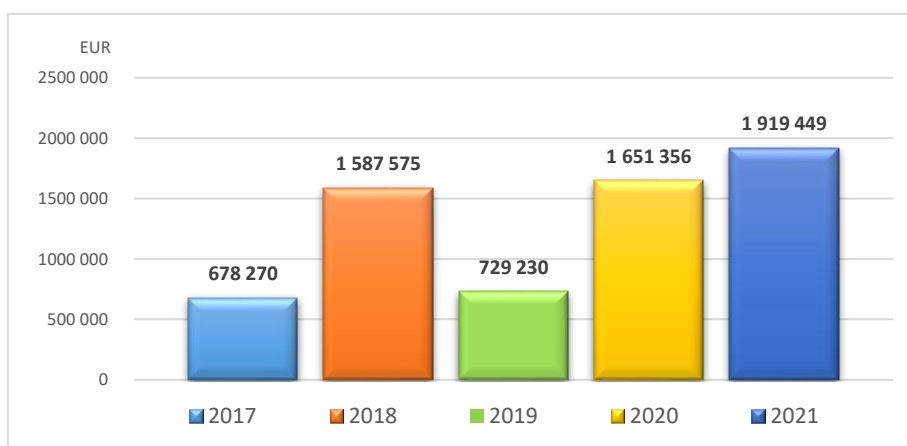

No Gráfico anterior é possível verificar que a entrega de bens efetuada, durante o quinquénio, originou um encargo total de 6.565.882 EUR.

Os encargos previstos no PA2021, no valor de 2.002.896,27 EUR, decorrentes do lançamento ao mercado do procedimento para a aquisição de equipamentos de fiscalização rodoviária para a PSP, equipamentos estes que faziam parte das necessidades desta FS ainda para o ano de 2020, mas que tiveram de transitar para 2021 devido à não conclusão da tramitação pré-contratual em 2020, sendo por isso incluídas no PA2021. Assim, a execução material e financeira refletiu a aquisição destes equipamentos.

Neste sentido, a aquisição de 459 equipamentos na medida EFE originou um encargo de 1.919.449 EUR, o que corresponde a uma execução financeira em relação à dotação corrigida líquida de 94,55%, conforme se pode verificar no Quadro 27:

Quadro 27 - Execução Financeira da Medida EFE, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
EFE	2 320 000	2 030 000	1 919 449	82,73%	94,55%


(*) Dotação constante do “Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança” publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março.

Os investimentos realizados em 2021 encontram-se detalhados no Anexo VI – Medida EFE ao presente relatório.

4.6.2. Medida Equipamento para Funções Especializadas – Execução Material

No Gráfico 26, apresenta-se um resumo da execução material, da medida equipamento de proteção individual da LPIEFSS, desde 2017:

Gráfico 26 - Execução material da medida EFE, no período 2017-2021

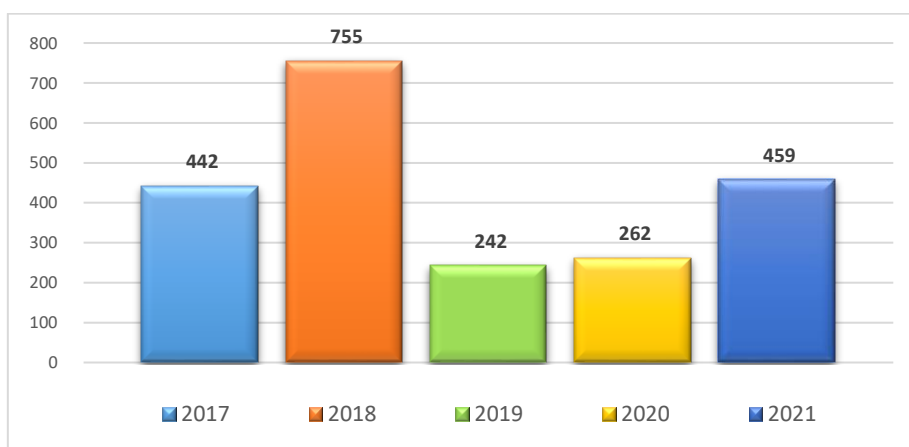

No Gráfico anterior podemos verificar que, durante o quinquénio, foram entregues um total 2.160 equipamentos, maioritariamente equipamentos destinados à fiscalização rodoviária.

O indicador objetivo de execução material, definido na LPIEFSS, para esta medida foi o número de equipamentos especializados adquiridos para a GNR e para a PSP.

Este indicador na LPIEFSS, para 2021, tinha por objetivo, a aquisição de 79 equipamentos especiais para a GNR e 1428 para a PSP, conforme indicadores previstos em 2017, contudo foi aprovado no PA2021 a

aquisição de 80 equipamentos especiais para GNR e 457 para a PSP, conforme se apresenta nos gráficos seguintes:

Gráfico 27 - Execução material da medida EFE vs Indicador Objetivo, por FSS, em 2021


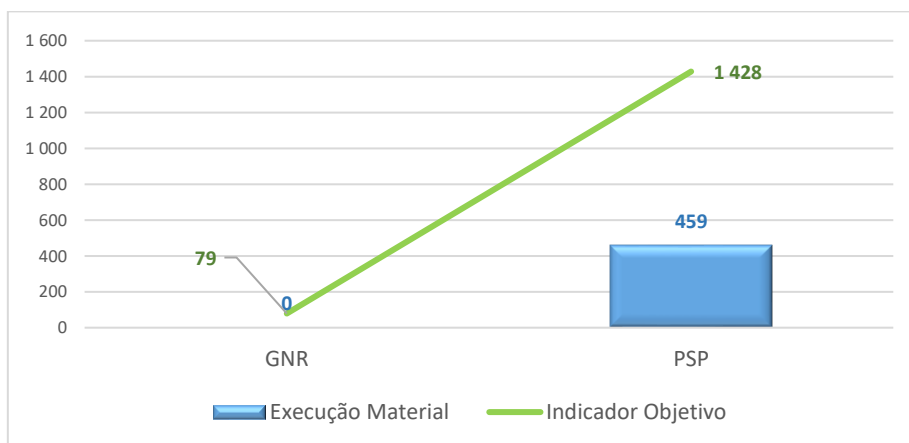


Gráfico 28 - Execução material da medida EFE vs Quantidades previstas PA2021, por FSS

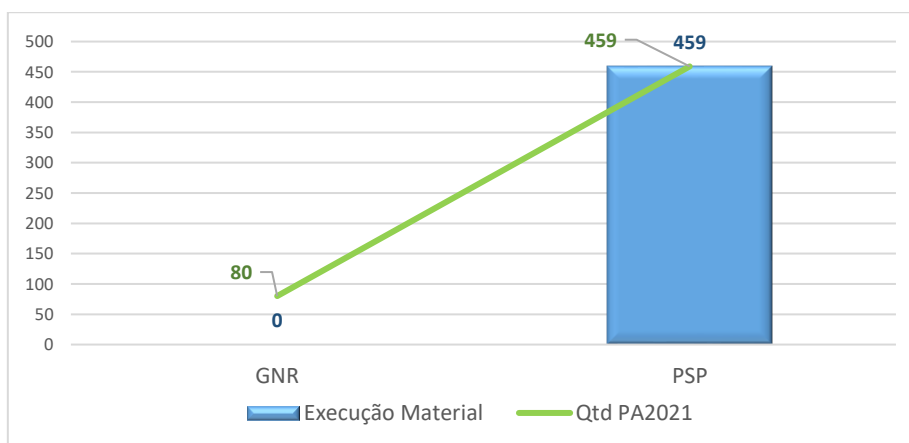


Através do gráfico anterior podemos verificar que não foi possível ter execução material de apenas 80 equipamentos de fiscalização rodoviária para a GNR, em relação ao planeado e previsto no PA2021. Se tivermos em conta a execução material (459 equipamentos) em relação às quantidades de equipamentos a adquirir previstos no PA2021 (539 equipamentos), podemos concluir que no ano de 2021 a execução material foi de 85,16%.

4.7. Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação

4.7.1. Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Execução Financeira

Os investimentos efetuados, desde 2017, na medida de STIC, encontram-se resumidos no Gráfico 29:

Gráfico 29 - Execução financeira da medida STIC, no período 2017-2021

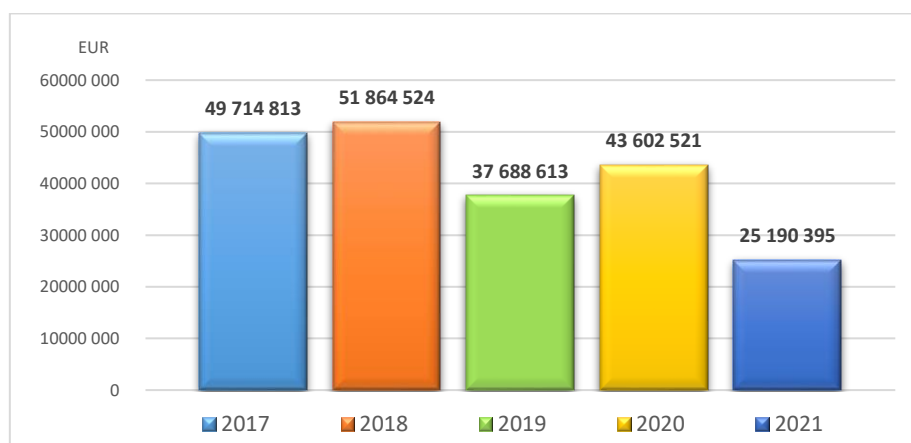

Esta medida está dividida em diversos projetos, que apresentam um carácter de transversalidade ao MAI, no âmbito das competências cometidas à SGMAI, conforme se apresenta no Quadro 28.

Quadro 28 - Execução financeira plurianual da medida STIC, por projeto, no período 2017-2021

Projeto	Entidade	Execução					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
9487 Comunicações de segurança e emergência	SGMAI	41 442 790	46 393 594	23 799 919	26 534 066	12 661 101	150 831 470
11576 RESN - Rede de Emergência e Segurança Nacional	SGMAI					61 003	61 003
9493 SIVICC - Fase de Garantia e de Manutenção	SGMAI	10 824	2 909 526	2 739 204	2 310 145	0	7 969 699
9744 Linha 112.pt	SGMAI	2 738 692				0	2 738 692
9777 Linha 112.pt - Financiamento adicional	SGMAI	1 569 004	1 017 723	1 027 461	1 315 128	1 380 782	6 310 098
10096 Linha 112.pt - Investimentos complementares	SGMAI	16 768	0	0	1 251 150	417 050	1 684 968
10093 Sala supervisão e monitorização da RNSI	SGMAI	0	0	0	0	0	0
10100 Licenciamento informático para a segurança interna	SGMAI	3 012 591	0	5 521 662	5 521 662	5 521 662	19 577 576
10103 GEOMAI - Projetos a candidatar	SGMAI	239 297	589 507	220 847	364 695	498 089	1 912 433
10143 Cibersegurança do MAI	SGMAI	597 733	139 391	202 880	1 171 219	0	2 111 223
10190 Instalações e equipamentos para as FSS – Transferências p/ as FSS	PSP e GNR	87 115		0	0		87 115
10359 Outros Equipamentos TIC para as FSS	PSP e GNR		814 784	4 176 641	5 134 456	4 650 708	14 776 589
TOTAL		49 714 813	51 864 524	37 688 613	43 602 521	25 190 395	208 060 866

No Quadro anterior é possível verificar que as aquisições de bens e serviços efetuadas, durante o quinquénio, originaram um encargo total de 208.060.866 EUR.

Relativamente ao ano de 2021, a execução financeira da medida STIC originou um encargo global de 25.190.395 EUR, o que corresponde a uma execução financeira em relação à dotação corrigida líquida de 74,28%, conforme se pode verificar no Quadro 29.

Quadro 29 - Execução Financeira da Medida STIC, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
STIC	51 040 631	33 911 202	25 190 395	49,35%	74,28%

(*) A Dotação constante do "Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança" publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março, era de 46.324.432 EUR, contudo considerando a necessidade de reforço de 4.716.199 EUR, conforme referido no ponto 3.2.

A execução desta medida inclui os encargos decorrentes de contratos plurianuais, celebrados em anos anteriores, designadamente de encargos com o SIRESP, do fornecimento de eletricidade, encargos com arrendamento de estações base e demais infraestruturas tecnológicas já implementada, encargos com investimento e manutenção do 112.pt, Cibersegurança do MAI e outros equipamentos para as FSS.

Os investimentos realizados em 2021 encontram-se detalhados no Anexo VII – Medida STIC, ao presente relatório.

Para efeitos de análise da execução material da medida STIC devido a apresentar características distintas das medidas anteriores (as quais se referem essencialmente a fornecimento de bens e intervenções em infraestruturas), uma vez que assentam fortemente na componente de serviços associados à manutenção da infraestrutura tecnológica já implementada, não foram definidos indicadores objetivos para esta medida.

Assim, apresenta-se no Quadro 30 a execução financeira do Projeto 10359 – Equipamentos TIC, que se destina apenas às FSS, para 2021, tendo originado um encargo de 4.650.708 EUR, o que corresponde a uma execução financeira em relação à dotação corrigida líquida, para o projeto em causa, de 49,44%.

Quadro 30 - Execução Financeira da Medida STIC – Projeto 10359, em 2021 (%)

(Unidade: EUR)

Medida LPIEFSS	Dotação Inicial LPIEFSS* (1)	Dotação corrigida líquida (2)	Execução Financeira (3)	% Execução financeira em relação à dotação inicial (4) = (3)/(1)	% Execução financeira em relação à dotação corrigida líquida (4) = (3)/(2)
STIC – Projeto 10359	10 750 000	9 406 250	4 650 708	43,26%	49,44%


(*) Dotação tendo por base a dotação da medida STIC constante do “Mapa de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança” publicado em anexo à Lei nº 10/2017, de 3 de março, publicada no Diário da República, 1ª Série, nº 45, de 3 de março.

4.7.2. Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Execução Material (Projeto 10359)

Conforme referido anteriormente, no presente ponto será analisada a execução financeira da medida STIC, no âmbito do Projeto 10359 – Equipamentos TIC, que se destinam apenas às FSS.

No Gráfico 30, apresenta-se um resumo da execução material, da medida STIC da LPIEFSS, desde 2017:


Gráfico 30 - Execução material da medida STIC, no período 2017-2021

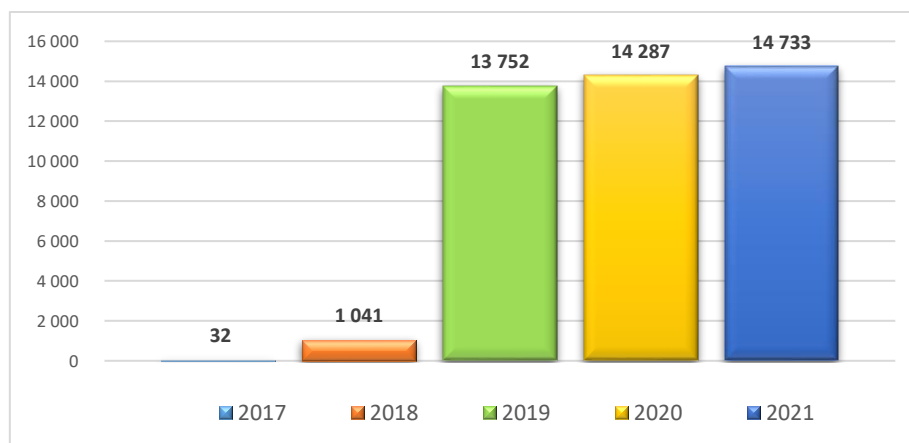

No Gráfico anterior podemos verificar que, durante o quinquénio, foram entregues um total 43.845 equipamentos, entre eles computadores de secretária e portáteis, equipamentos rádio e de comunicações, software, etc.

Por forma a evidenciar a execução material de 14.733 equipamentos em 2021, apresenta-se no Gráfico 31 um resumo dos equipamentos entregues às FSS:

Gráfico 31 - Execução material da medida STIC – Projeto 10359, por FSS, em 2021

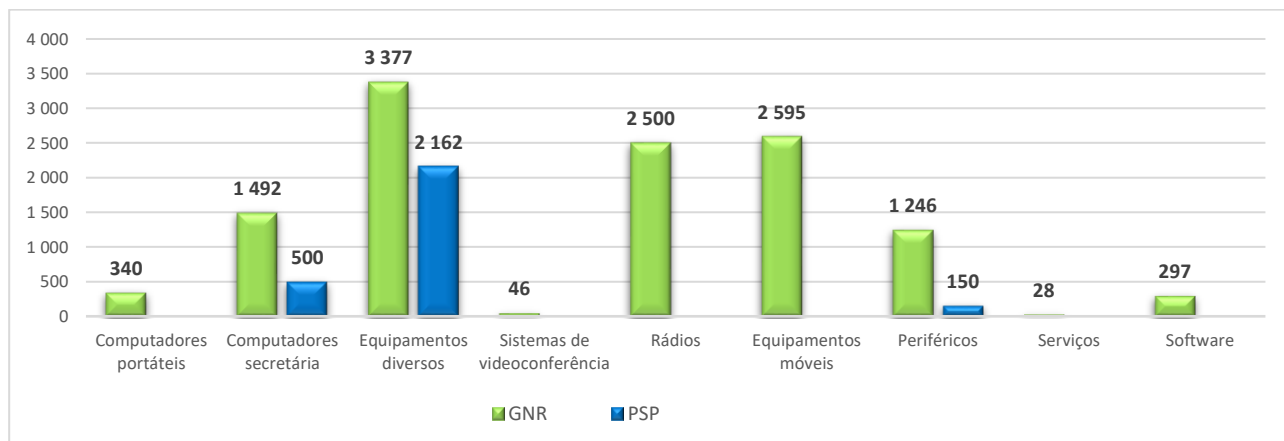

Atento o carácter essencialmente tecnológico desta medida, não foram definidos inicialmente indicadores objetivos.

4.7.3. Medida Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação – Compromissos Assumidos para 2022

Será ainda importante referir que transitaram bens a entregar em 2022 referentes a contratos celebrados em 2021, bem como os respetivos encargos, no valor de 2.369.382 EUR, conforme o Quadro 31:

Quadro 31 - Compromissos assumidos em anos anteriores, na Medida STIC, para 2022

FS	Nº de Equipamentos previstos entregar em 2022	Encargos Assumidos para 2022 (EUR)
GNR	2 593	2 112 588
PSP	352	256 794
Total	2 945	2 369 382

5. Saldos de Gerência

Nos quadros seguintes apresenta-se o saldo da LPIEFSS referente a 2021 tendo por base a previsão corrigida das receitas de impostos e as receitas próprias efetivamente cobradas, de cada medida, abatidas dos respectivos pagamentos, o que totaliza 69.842.133,88 EUR.

Quadro 32 – Saldos passíveis de transitar, para 2022

(um: EUR)

Medida	Fonte de Financiamento	Previsão Corrigida RI e Receita Cobrada RP* (1)	Pagamentos (2)	Saldo Potencial (1) - (2)
088 - Infraestruturas	311-RI não afetas a projetos cofinanciados	11 944 058,00	125 956,95	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	14 862 504,40	0,00	14 862 504,40
	522 - Saldos de RP Transitados	37 571 421,37	5 958 735,82	31 612 685,55
	515-RP do ano com possibilidade de transição	2 859 159,83	0,00	2 859 159,83
	541-Transferências de RP entre Organismos	7 276 777,71	136 231,10	7 140 546,61
Subtotal		74 513 921,31	6 220 923,87	56 474 896,39
089 - Veículos	311-RG não afetas a projetos cofinanciados	4 200 000,00	3 674 998,48	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	3 493,55	0,00	3 493,55
	522 - Saldos de RP Transitados	3 610 549,22	0,00	3 610 549,22
	515-RP do ano com possibilidade de transição	264 761,59	264 761,59	0,00
	541-Transferências de RP entre Organismos	9 887 500,00	9 887 397,45	102,55
Subtotal		17 966 304,36	13 827 157,52	3 614 145,32
090 - Armamento	311-RG não afetas a projetos cofinanciados	1 380 000,00	151 222,46	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	680 524,40	0,00	680 524,40
	522 - Saldos de RP Transitados	967 168,02	667 856,01	299 312,01
Subtotal		3 027 692,42	819 078,47	979 836,41
091 - Equipamento de Proteção Individual	311-RG não afetas a projetos cofinanciados	1 310 000,00	221 750,55	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	360 993,11	0,00	360 993,11
	522 - Saldos de RP Transitados	96 128,83	92 727,61	3 401,22
Subtotal		1 767 121,94	314 478,16	364 394,33
092 - Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	311-RG não afetas a projetos cofinanciados	1 000 000,00	480 205,36	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	456 733,95	0,00	456 733,95
	522 - Saldos de RP Transitados	353 279,79	0,00	353 279,79
Subtotal		1 810 013,74	480 205,36	810 013,74
093 - Equipamento para Funções Especializadas	311-RG não afetas a projetos cofinanciados	2 320 000,00	1 919 448,53	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	1 611 075,35	0,00	1 611 075,35
	522 - Saldos de RP Transitados	776 234,78	0,00	776 234,78
Subtotal		4 707 310,13	1 919 448,53	2 387 310,13
087 - Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação e 094 - Comunicação e segurança	311-RG não afetas a projetos cofinanciados	33 748 168,00	22 419 230,97	0,00
	313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	3 652 638,24	0,00	3 652 638,24
	522 - Saldos de RP Transitados	1 275 833,87	0,00	1 275 833,87
	541-Transferências de RP entre Organismos	3 054 229,53	2 771 164,08	283 065,45
Subtotal		41 730 869,64	25 190 395,05	5 211 537,56
Total		145 523 233,54	48 771 686,96	69 842 133,88

Quadro 33 – Saldo potencial de transitar, para 2022, por fonte de financiamento

(um: EUR)

Fonte de Financiamento	Previsão Corrigida RG e Receita Cobrada RP* (1)	Pagamentos* (2)	Saldo Potencial (1) - (2)
311-RG não afetas a projetos cofinanciados	55 902 226	28 992 813	0
313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados	21 627 963	0	21 627 963
522 - Saldos de RP Transitados	44 650 616	6 719 319	37 931 296
515-RP do ano com possibilidade de transição	3 123 921	264 762	2 859 160
541-Transferências de RP entre Organismos	20 218 507	12 794 793	7 423 715
Total	145 523 234	48 771 687	69 842 134

Os saldos de gerência a transitar, já certificados pela Direção-Geral do Orçamento, nos termos conjugados do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho², e do n.º 5 do artigo 2.º da LPIEFSS, com exceção no que se refere a receitas de impostos - atento o disposto no ponto 43 da circular 1400 - correspondem aos saldos apurados em todas as medidas da Lei, sendo a autorização para a sua aplicação em despesa da competência da Tutela no caso das medidas Infraestruturas, Armamento e EPI, e da competência das Finanças para as restantes medidas.

À semelhança do ocorrido em 2018, o processo de transição de saldos de receitas de impostos da LPIEFSS decorre em cumprimento às instruções da DGO, tendo passado pelo levantamento em PLC do montante a transitar e da realização de pagamento para conta própria do serviço, ações realizadas em 2020.

Em 2021 procedeu-se à entrega do valor a transitar nos Cofres do Estado, como Reposição Não Abatida aos Pagamentos (RNAP). A transição deste montante para 2021 nos termos do ponto 43 da Circular 1400 da DGO, ocorreu no final de dezembro, que impossibilitou a realização atempada de propostas de abertura de crédito especial para aplicação em despesa.

² Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2019.

Quadro 34 – Evolução dos Saldos da LPIEFSS ao longo do quinquénio

		2017			2018			2019			2020			2021		
Medida	FF	Receita cobrada	Execução	Saldo	Receita cobrada	Execução	Saldo	Receita cobrada	Execução	Saldo	Receita cobrada	Execução	Saldo	Receita cobrada	Execução	Saldo
088 - Infraestruturas	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados	1 339 109 €	1 339 109 €		3 173 681 €	229 670 €	2 944 011 €	1 446 738 €	1 446 738 €		15 792 134 €	929 630 €	14 862 504 €	125 957 €	125 957 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados							2 944 011 €	518 999 €	2 425 012 €				14 862 504 €		14 862 504 €
	121/522 - Saldos de RP Transitados				12 124 943 €	738 281 €	11 386 662 €	24 028 551 €	422 767 €	23 605 784 €	33 475 571 €	3 452 253 €	30 023 318 €	37 571 421 €	5 958 736 €	31 612 686 €
	122-RP do ano sem possibilidade de transição	6 851 €		6 851 €												
	123/515-RP do ano com possibilidade de transição				480 381 €		480 381 €				6 130 949 €		6 130 949 €	2 859 160 €		2 859 160 €
	129/541-Transferências de RP entre Organismos	12 221 025 €	102 933 €	12 118 092 €	12 161 509 €		12 161 509 €	9 534 246 €	2 089 471 €	7 444 775 €	1 417 154 €		1 417 154 €	7 276 778 €	136 231 €	7 140 547 €
	Subtotal	13 566 985 €	1 442 042 €	12 124 943 €	27 940 514 €	967 951 €	26 972 563 €	37 953 545 €	4 477 974 €	33 475 571 €	56 815 808 €	4 381 883 €	52 433 926 €	62 695 820 €	6 220 924 €	56 474 896 €
089 - Veículos	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados				425 041 €	425 041 €		9 182 593 €	9 182 593 €		1 485 653 €	1 482 159 €	3 494 €	3 674 998 €	3 674 998 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados													3 494 €		3 494 €
	121/522 - Saldos de RP Transitados							2 134 387 €		2 134 387 €	3 610 530 €		3 610 530 €	3 610 549 €		3 610 549 €
	123/515-RP do ano com possibilidade de transição													264 762 €	264 762 €	
	129/541-Transferências de RP entre Organismos				4 695 939 €	2 561 552 €	2 134 387 €	11 808 427 €	10 332 284 €	1 476 143 €	12 229 458 €	12 229 439 €	19 €	9 887 500 €	9 887 397 €	103 €
090 - Armamento	Subtotal				5 120 979 €	2 986 592 €	2 134 387 €	23 125 406 €	19 514 876 €	3 610 530 €	17 325 641 €	13 711 598 €	3 614 043 €	17 441 303 €	13 827 158 €	3 614 145 €
	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados	372 358 €	372 358 €					653 175 €	653 175 €		796 600 €	116 076 €	680 524 €	151 222 €	151 222 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados													680 524 €		680 524 €
	121/522 - Saldos de RP Transitados				1 170 393 €	1 157 988 €	12 405 €	712 500 €		712 500 €	2 226 464 €	1 259 296 €	967 168 €	967 168 €	667 856 €	299 312 €
	129/541-Transferências de RP entre Organismos	1 685 818 €	515 425 €	1 170 393 €	979 999 €	279 905 €	700 095 €	1 689 453 €	175 489 €	1 513 964 €						
091 - Equipamento de Proteção Individual	Subtotal	2 058 176 €	887 783 €	1 170 393 €	2 150 392 €	1 437 893 €	712 500 €	3 055 128 €	828 664 €	2 226 464 €	3 023 064 €	1 375 371 €	1 647 692 €	1 798 915 €	819 078 €	979 836 €
	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados	135 300 €	135 300 €					673 126 €	673 126 €		1 031 519 €	670 526 €	360 993 €	221 751 €	221 751 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados													360 993 €		360 993 €
	121/522 - Saldos de RP Transitados				1 791 054 €	1 258 772 €	532 282 €	1 406 471 €	824 607 €	581 864 €	581 864 €	485 736 €	96 129 €	96 129 €	92 728 €	3 401 €
	129/541-Transferências de RP entre Organismos	2 149 700 €	358 646 €	1 791 054 €	1 459 999 €	585 810 €	874 190 €									
092 - Equipamento de Apoio à Atividade Operacional	Subtotal	2 285 000 €	493 946 €	1 791 054 €	3 251 053 €	1 844 582 €	1 406 472 €	2 079 597 €	1 497 733 €	581 864 €	1 613 383 €	1 156 262 €	457 122 €	678 872 €	314 478 €	364 394 €
	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados	53 339 €	53 339 €					802 132 €	802 132 €		527 748 €	71 014 €	456 734 €	480 205 €	480 205 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados													456 734 €		456 734 €
	121/522 - Saldos de RP Transitados							353 280 €		353 280 €	353 280 €		353 280 €	353 280 €		353 280 €
	129/541-Transferências de RP entre Organismos				770 641 €	417 361 €	353 280 €				218 202 €	218 202 €				
093 - Equipamento para Funções Especializadas	Subtotal	53 339 €	53 339 €		770 641 €	417 361 €	353 280 €	1 155 411€	802 132 €	353 280 €	1 099 230 €	289 216 €	810 014 €	1 290 219 €	480 205 €	810 014 €
	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados	37 584 €	37 584 €					543 602 €	543 602 €		3 262 431 €	1 651 356 €	1 611 075 €	1 919 449 €	1 919 449 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados													1 611 075 €		1 611 075 €
	121/522 - Saldos de RP Transitados							776 235 €		776 235 €	776 235 €		776 235 €	776 235 €		776 235 €
	129/541-Transferências de RP entre Organismos	388 144 €	388 144 €		2 363 810 €	1 587 575 €	776 235 €	200 547 €	200 547 €							
087 - Sistemas de Tecnologias de Informação e Comunicação e 094 - Comunicação e segurança	Subtotal	425 727 €	425 727 €		2 363 810 €	1 587 575 €	776 235 €	1 520 383 €	744 149 €	776 235 €	4 038 666 €	1 651 356 €	2 387 310 €	4 306 759 €	1 919 449 €	2 387 310 €
	111/311-RG não afetas a projetos cofinanciados	43 001 868 €	43 001 868 €		48 537 584 €	48 537 584 €		32 368 741 €	32 368 741 €		39 509 183 €	35 856 545 €	3 652 638 €	22 419 231 €	22 419 231 €	
	113/313 - Saldos de RG não afetas a projetos cofinanciados													3 652 638 €		3 652 638 €
	153 - RG afetas a projetos cofinanciados	750 338 €	750 338 €													
	157-RG afetas a projetos cofinanciados-Outros	82 497 €	82 497 €		258 449 €	258 237 €		367 691 €	101 152 €							
	241 - FSE	1 389 242 €	1 389 241 €	1 €												
	282-Outros	156 800 €	156 800 €		331 270 €	331 270 €		119 695 €	119 695 €							
	288 - Saldos de projetos comunitários	599 113 €	599 113 €													
	121/522 - Saldos de RP Transitados							1 €		1 €	1 275 834 €		1 275 834 €	1 275 834 €		1 275 834 €
	122-RP do ano sem possibilidade de transição				1 922 650 €	1 922 650 €					781 480 €	781 480 €				
	129/541-Transferências de RP entre Organismos	3 666 291 €	3 666 291 €		814 785 €	814 784 €	1 €	6 374 859 €	5 099 026 €	1 275 833 €	6 964 495 €	6 964 495 €		3 054 230 €	2 771 164 €	283 065 €
	Subtotal	49 646 149 €	49 646 148 €	1 €	51 864 738 €	51 864 524 €	1 €	39 230 987 €	37 688 613 €	1 275 834 €	48 530 993 €	43 602 520 €	4 928 472 €	30 401 933 €	25 190 395 €	5 211 538 €
													Total 2021	118 613 821	48 771 687	69 842 134

6. Conclusões

O presente relatório apresenta a informação necessária ao controlo da execução da LPIEFSS. As entidades beneficiárias a GNR, a PSP e o SEF colaboram com a SGMAI no planeamento, execução e monitorização da LPIEFSS.

O presente relatório ao proceder à monitorização da Lei em questão, procura transmitir e fomentar princípios de transparência, prestação de contas e mecanismos de controlo vertical e horizontal.

Circunstancial e inevitavelmente, a pandemia causada pelo vírus *Covid-19* a nível mundial impôs, novos e elevados, desafios à SGMAI, às FSS e ao mercado, colocando a disponibilidade e prontidão dos operadores económicos em perspetiva e limitando o lançamento de procedimentos, a execução material dos mesmos, bem como a capacidade de mobilização e deslocação que está inerente à forma como a Medida Infraestruturas é executada.

Esta situação veio ainda ter repercussões na quebra das receitas de transferências entre os organismos, inicialmente previstas, correspondendo a um desvio negativo de 8.622.509 EUR.

Em síntese, ao analisarmos a execução financeira tendo em consideração o global das medidas da LPIEFSS, podemos concluir que a execução financeira, para o quinquénio, no valor de 304.924.868 EUR, em relação à dotação inscrita nos orçamentos de cada ano (2017-2021) no valor de 476.250.340 EUR, foi de 64,03%. Contudo se a análise recair sobre a execução financeira em relação à dotação corrigida líquida abatida dos saldos da gerência anterior aplicados em despesa, no valor de 431.667.170 EUR, atingiu-se os 70,64%.

Se considerarmos apenas nos dados do ano de 2021, podemos concluir que a execução financeira, no valor de 48.771.687 EUR, em relação à dotação inicialmente prevista para 2021, no valor de 95.743.242 EUR, foi de 50,94%, contudo se a análise recair sobre a execução financeira em relação à dotação corrigida líquida, no valor de 117.876.958 EUR, apenas se atingiu os 41,38%.

Esta situação deve-se em especial aos saldos que anualmente têm vindo a transitar na medida Infraestruturas. Este crescente valor de saldos deve-se à morosidade da tramitação processual e ao carácter plurianual da execução dos investimentos desta medida. Estas condicionantes são resultantes das características específicas de cada intervenção, da sua complexidade e dimensão, das vicissitudes associadas ao desenvolvimento de empreitadas - onde se pode incluir a imperatividade de trabalhos complementares e a formalização de ligação a diversos serviços – e que transferem as datas de realização e de conclusão de diversos investimentos para os anos seguintes.

Relativamente ainda à execução material e financeira da medida infraestrutura é de referir que devido à necessidade de autorização prévia dos encargos plurianuais através de Portaria de Extensão de Encargos, de

forma a dar cumprimento do artigo 22.º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, para lançar novos procedimentos tendo em vista a aquisição de empreitadas, ou de assinatura de Contratos Interadministrativos ou Protocolos, conduziu invariavelmente ao atraso na execução material e financeira, em 2021, de muitas das intervenções planeadas.

Anexo I – Medida Infraestruturas

Tabela 1 - Resumo dos contratos com execução financeira, em 2021, por FSS – Medida Infraestruturas

FSS	Concelho	Instalação	Tipo de Intervenção	Tipo de Contrato	Proc. n.º	Valor Adjudica do c/ IVA	Execução					Total
							2017	2018	2019	2020	2021	
GNR	Alcanena	Posto Territorial Alcanena	Reabilitação de novas instalações	Projeto	58/DSUMC/16	11 393	10 254	0	0	0	1 139	11 393
	Alenquer	Destacamento Territorial de Alenquer	Reabilitação de novas instalações	Contrato Interadmin.	051/DPIE/2018	1 558 948		0	0	0	694 072	694 072
	Almada	Posto Territorial da Costa da Caparica	Reabilitação atuais instalações	Empreitada	16/DPIE/2020	132 225				97 541	34 684	132 225
		Posto Territorial da Costa da Caparica-1ª adicional			16/DPIE/2020-1	18 726				0	18 726	18 726
	Alpiarça	Posto Territorial de Alpiarça	Elaboração Projeto de Execução	Projeto	136/DPIE/2018	18 395		0	0	0	5 519	5 519
	Anadia	Posto Territorial Anadia	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	09/DPIE/2020	1 087 628				0	425 017	425 017
	Avis	Posto Territorial Avis	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	63/DPIE/2019	1 069 874			0	0	46 313	46 313
	Barrancos	Posto Territorial de Barrancos	Reabilitação atuais instalações	Empreitada	119/DPIE/2018	307 273		0	20 476	283 516	3 282	307 273
		Posto Territorial de Barrancos-3ª adicional			44/DPIE/2020	3 676				0	3 676	3 676
		Posto Territorial de Barrancos-4ª adicional			119/DPIE/18-1	5 784		0	0	0	5 784	5 784
	Barrancos	Posto Territorial de Barrancos	Reparação de caleiras	Empreitada	12/DPIE/2021	5 090					5 090	5 090
	Bragança	Posto Territorial de Bragança	Demolição das instalações afetadas anteriormente ao GIPS	Empreitada	40/DPIE/2019	92 135			0	77 871	14 264	92 135
		Posto Territorial de Bragança-1ª adicional			52/DPIE/2020	3 590				0	3 590	3 590
		Posto Territorial de Bragança-2ª adicional			40/DPIE/2019-1	5 619			0	0	5 619	5 619
		Posto Territorial de Bragança-Revisão de preços			40/DPIE/2019-1	625			0	0	625	625
	Gondomar	Posto Territorial Medas	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	30/DPIE/19	1 017 955			0	62 372	902 254	964 626
	Lagos	Posto Territorial de Lagos	Reabilitação de novas instalações	Contrato Interadmin.	48/DPIE/2018	427 607		0	0	190 239	145 132	335 370
	Lisboa	GNR-USHE-Trabalhos de Levantamento de Infraestruturas Enterradas	Demolição atuais instalações	Empreitada	66/DPIE/2020	11 673				0	11 673	11 673
	Macedo Cavaleiros	Posto Territorial Macedo Cavaleiros	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	124/DPIE/2018	744 816		0	0	155 422	577 260	732 681
	Mafra	Posto Territorial Livramento	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	66/DPIE/19	805 565			0	140 381	636 004	776 385
	Mesão Frio	Posto Territorial de Mesão Frio	Reabilitação de novas instalações	Protocolo	08/DPIE/21	7 872					7 872	7 872
	Mondim de Basto	Posto Territorial Mondim de Basto	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	31/DPIE/2019	295 997			0	16 462	227 199	243 661
	Oliveira de Azeméis	Posto Territorial Cucujães	Reabilitação de novas instalações	Contrato Interadmin.	140/DPIE/2018	690 000		0	70 878	396 912	60 986	528 776
	Salvaterra de Magos	Posto Territorial Salvaterra de Magos-Revisão de preços	Reabilitação de novas instalações	Empreitada	4/DPIE/18-1	1 495		0	0	0	1 495	1 495
	Serpa	Posto Territorial de Serpa - Revisão de preços	Reabilitação atuais instalações	Empreitada	115/DPIE/2018-1	29 040		0	0	0	29 040	29 040
	Sintra	Posto Territorial de Queluz-Clinica Veterinária	Levantamento Topográfico	Prestação de Serviços	16/DPIE/2021	923					923	923
	Vários	Vistoria Técnica 65 Torres Vigilancia Incendios Florestais	Vistoria Técnica	Prestação de Serviços	17/DPIE/2020	27 983				0	27 983	27 983
	Viana do Alentejo	Posto Territorial de Viana do Alentejo	Elaboração Projeto de Execução	Projeto	43/DPIE/2019	15 990			0	4 797	9 594	14 391
	Vila Nova de Gaia	Posto Territorial de Avintes	Elaboração Projeto de Execução	Projeto	05/DPIE/2021	3 690					3 690	3 690
	Vila Real Santo António	Posto Territorial Vila Real Santo António	Parecer REN	Prestação de Serviços	35/DPIE/21	135					135	135
	Vimioso	Posto Territorial Vimioso	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	65/DPIE/2020	821 924				0	36 602	36 602
Total GNR						9 223 647	10 254	0	91 354	1 425 511	3 945 242	5 472 361

Tabela 1 - Resumo dos contratos com execução financeira, em 2021, por FSS – Medida Infraestruturas (continuação)

FSS	Concelho	Instalação	Tipo de Intervenção	Tipo de Contrato	Proc. n.º	Valor Adjudicado c/ IVA	Execução					Total
							2017	2018	2019	2020	2021	
PSP	Barreiro	Esquadra do Barreiro	Construção de raiz de novas instalações	Contrato Interadmin.	23/DPIE/18	1 310 128		44 217	0	0	232 224	276 441
	Elvas	Esquadra Elvas	Reabilitação atuais instalações	Empreitada	01/DPIE/2020	258 268				152 660	105 608	258 268
	Leiria	CD Leiria	Contenção deformação paredes Exteriores	Empreitada	03/DPIE/2021	11 897					11 897	11 897
	Matosinhos	Divisão Policial de Matosinhos	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	27/DPIE/2019	1 107 000			0	0	778 928	778 928
	Portimão	Divisão Policial de Portimão	Reabilitação atuais instalações	Contrato Interadmin.	14/DPIE/2018	1 721 602		0	0	0	183 209	183 209
	Porto	Esquadra Aljube	Serviços Complementares	Projeto	61/DPIE/2019-1	2 933			0	0	2 933	2 933
	Porto	Complexo do Viso - Indeminização por revogação do contrato	Revogação Contrato	Projeto	15/DPIE/2018	44 280		0	0	0	44 280	44 280
	Seixal	Esquadra Seixal	Elaboração Projeto de Execução	Projeto	04/DPIE/2020	5 763				0	5 763	5 763
	Sintra	DN/ Palacete Águas Livres-Belas - Revisão de preços	Reabilitação atuais instalações	Empreitada	6/DPIE/18-1	32 736		0	0	0	32 736	32 736
	Sintra	Belas-Palacete Águas Livres	Fiscalização e CSO	Prestação de Serviços	131/DPIE/2018	10 037		0	5 904	3 542	590	10 037
	Sintra	DN/Palacete da Quinta das Águas Livres em Belas	Fiscalização e CSO-1ª adicional	Prestação de Serviços	48/DPIE/2020	3 936				0	3 936	3 936
	Valongo	Esquadra de Valongo	Reabilitação de novas instalações	Contrato Interadmin.	67/DPIE/2019	898 806			0	130 607	744 181	874 788
	Vila Real Santo António	Esquadra Vila Real de Santo António	Reabilitação atuais instalações	Empreitada	47/DPIE/2019	781 435			0	0	109 925	109 925
	VRSAntónio	Edifício Alfandega e Apeadeiro	Fiscalização e CSO	Prestação de Serviços	61/DPIE/2020	38 944				0	19 472	19 472
Total PSP						6 215 869		44 217	5 904	286 809	2 275 682	2 612 613
Total Geral						15 439 516	10 254	44 217	97 258	1 712 320	6 220 924	8 084 974

Anexo II – Medida Veículos

Tabela 2 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida Veículos

FSS	Proc. nº	Designação	Lote	Fornec.	Contrato nº	Data de início	Valor contratual (s/ IVA)	Qtd 2021	Valor unitário (c/ IVA)	Encargo para 2021 (c/ IVA)	Data Prevista p/ Entrega
GNR	177/DSUMC/2017 (CP-V 022/01/2018)	Motociclos - Patrulhamento trânsito	5	Yamaha	CP-V 022/01/2017.Q	15-08-2018	1 076 353,74 €	21	18 388 €	386 143 €	25/05/21
		Pronto socorro (reboque)	10	Iveco	CP-V 022/01/2017.H	15-08-2018	197 816,68 €	1	60 829 €	60 829 €	21/05/21
		Investigação criminal	11	Renault	CP-V 022/01/2017.K	15-08-2018	347 928,01 €	6	16 460 €	98 759 €	21/05/21
		Investigação criminal	12	FCA	CP-V 022/01/2017.E	15-08-2018	309 248,75 €	6	20 020 €	120 118 €	02/07/21
		Patrulhamento trânsito	13	Citroen	CP-V 022/01/2017.C	01-09-2018	6 532 801,06 €	115	19 503 €	2 242 777 €	02/09/21
		Patrulhamento turístico	16	SIVA	CP-V 022/01/2017.M	01-09-2018	195 778,62 €	2	40 135 €	80 269 €	02/07/21
		Investigação criminal	17	Toyota	CP-V 022/01/2017.O	15-08-2018	572 170,00 €	7	24 268 €	169 875 €	04/06/21
		Patrulhamento	18	Toyota	CP-V 022/01/2017.O	15-08-2018	694 590,00 €	11	21 906 €	240 970 €	04/06/21
		Fiscalização Rodoviária	19	SIVA	CP-V 022/01/2017.M	01-09-2018	2 383 096,32 €	27	29 608 €	799 421 €	05/03/21
		Manutenção ordem pública	31	Citroen	CP-V 022/01/2017.C	01-09-2018	747 507,70 €	5	45 972 €	229 859 €	22/12/21
		Canídeos	38	Citroen	CP-V 022/01/2017.C	01-09-2018	249 700,11 €	4	21 938 €	87 751 €	15/10/21
		Investigação Criminal	40	Renault	CP-V 022/01/2017.K	15-08-2018	437 775,50 €	7	21 539 €	150 770 €	21/10/21
		Posto móvel	43	FCA	CP-V 022/01/2017.E	15-08-2018	143 232,75 €	1	35 235 €	35 235 €	02/07/21
		Patrulhamento territorial	45	Toyota	CP-V 022/01/2017.O	15-08-2018	1 685 480,00 €	17	35 744 €	607 645 €	14/06/21
		Patrulhamento territorial e trânsito	30.1	Renault	CP-V 022/01/2017.K	15-08-2018	724 815,10 €	10	26 221 €	262 213 €	22/12/21
	Fiscalização Rodoviária	30.2	Renault	CP-V 022/01/2017.K	15-08-2018	632 010,34 €	7	29 899 €	209 293 €	22/12/21	
	Subtotal Proc. 177/DSUMC/17							247		5 781 925 €	
	99/DPIE/2018 (CP-V 029/01/2018)	Motociclos	1	BMW	CP-V 029/01/2018.A	09-04-2019	182 152,42 €	2	8 617 €	17 234 €	09/07/21
		Fiscalização Rodoviária	3	BMW	CP-V 029/01/2018.A	09-04-2019	559 040,16 €	5	42 976 €	214 881 €	25/05/21
	Subtotal Proc. 99/DPIE/18							7		232 115 €	
	55/DPIE/2018 (CP-V 032/01/2018)	Motociclos - Patrulhamento/Fiscalização de trânsito	1	Yamaha	CP-V 032/01/2018.G	12-07-2019	119 379,08 €	11	5 063 €	55 697 €	30/06/21
		Motociclos - Serviço de estafeta	2	Yamaha	CP-V 032/01/2018.G	12-07-2019	81 530,80 €	3	7 714 €	23 142 €	30/06/21
		Investigação criminal	5	Citroen	CP-V 032/01/2018.A	12-07-2019	489 013,20 €	14	16 708 €	233 894 €	04/06/21
		Patrulhamento territorial	6	Renault	CP-V 032/01/2018.D	12-07-2019	245 933,27 €	3	27 500 €	82 499 €	09/12/21
		Transporte pessoal	18	Mercedes	CP-V 032/01/2018.I	12-07-2019	255 600,60 €	1	78 597 €	78 597 €	23/07/21
		Transporte pessoal	19	MAN TRUCK	CP-V 032/01/2018.B	12-07-2019	547 470,00 €	1	224 463 €	224 463 €	05/03/21
	Subtotal Proc. 55/DPIE/18							33		698 292 €	
Total GNR							287		6 712 333 €		
PSP	177/DSUMC/2017 (CP-V 022/01/2018)	MOP	35	Mercedes	CP-V 022/01/2017.I	15-08-2018	243 902,40 €	3	50 000 €	150 000 €	29/04/21
		MOP	33	Mercedes	CP-V 022/01/2017.I	15-08-2018	1 934 134,80 €	10	61 000 €	609 996 €	29/04/21
		Inv. Criminal	14	Renault	CP-V 022/01/2017.L	15-08-2018	882 216,32 €	14	16 955 €	237 371 €	25/10/21
		Carros Patrulha	20	Renault	CP-V 022/01/2017.L	15-08-2018	5 678 230,75 €	119	18 876 €	2 246 278 €	20/05/21
		CP Trânsito	21	FCA	CP-V 022/01/2017.F	15-08-2018	2 244 209,50 €	43	21 234 €	912 991 €	26/04/21
		Motociclos - Escolta/DT	5	Yamaha	CP-V 022/01/2017.R	15-08-2018	621 061,09 €	9	16 976 €	152 781 €	19/02/21
		Canídeos	39	Citroen	CP-V 022/01/2017.D	01-09-2018	152 130,80 €	3	23 390 €	70 170 €	07/10/21
		Transporte detidos	42	Citroen	CP-V 022/01/2017.D	01-09-2018	277 915,20 €	4	22 789 €	91 156 €	22/11/21
		Carros Patrulha	41	Renault	CP-V 022/01/2017.L	15-08-2018	207 132,64 €	11	23 161 €	254 773 €	12/10/21
		Corpo de segurança pessoal	22	SIVA	CP-V 022/01/2017.N	01-09-2018	1 332 775,52 €	12	39 983 €	479 800 €	21/06/21
		Canídeos	37	FCA	CP-V 022/01/2017.F	15-08-2018	275 544,80 €	2	42 365 €	84 730 €	26/04/21
	Subtotal Proc. 177/DSUMC/17							230		5 290 048 €	
	55/DPIE/2018 (CP-V 032/01/2018)	Motociclos - Patrulhamento de trânsito	3	Yamaha	CP-V 032/01/2018.H	12-07-2019	344 158,08 €	14	10 079 €	141 105 €	28/06/21
		Patrulhamento territorial	7	Renault	CP-V 032/01/2018.J	12-07-2019	322 099,82 €	4	28 299 €	113 195 €	22/09/21
		Proteção de testemunhas	12	SIVA	CP-V 032/01/2018.E	12-07-2019	971 591,04 €	12	24 897 €	298 764 €	25/02/21
		Transporte pessoal (TP 8)	13	Toyota	CP-V 032/01/2018.F	12-07-2019	575 681,92 €	8	32 186 €	257 487 €	12/07/21
		Patrulha com proteção balística	14	SIVA	CP-V 032/01/2018.E	12-07-2019	1 669 284,08 €	14	47 749 €	668 490 €	29/04/21
		Transporte especial UEP-CIEXSS	17	Mercedes	CP-V 032/01/2018.C	12-07-2019	95 770,00 €	1	58 899 €	58 899 €	25/10/21
	Subtotal Proc. 55/DPIE/18							53		1 537 940 €	
Total PSP							283		6 827 987 €		
SEF	177/DSUMC/2017 (CP-V 022/01/2018)	Investigação criminal	12	FCA	CP-V 022/01/2017.G	15-08-2018	1 032 749,35 €	14	20 488 €	286 838 €	08/09/21
Total SEF							14		286 838 €		
Total Geral							584		13 827 158 €		

Anexo III – Medida Armamento

Tabela 3 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida Armamento

FSS	Proc. nº	Contrato nº	Data Início	Valor contratual (s/ IVA)	Designação	Descrição	Execução material	Execução financeira (c/ IVA)	Data de entrega
GNR	4/DPIE/2019	101/2019	25-07-2019	225 670,81 €	Pistolas Glock	Pistola GLOCK 19, Gen5 - calibre 9x19	200	117 993,90 €	29/06/2021
	5/DPIE/2019	27/2019	25-03-2019	33 840,00 €	Acessórios	Mira Red Dot Aimpoint Micro T-2, para aplicação na Pistola-metralhadora HK MP5 N (Special Operations Forces - SOF)	35	24 280,20 €	09/03/2021
	6/DPIE/2019	97/2019	19-07-2019	159 763,89 €	Acessórios	Sistema de pontaria Laser STEINER Modelo DBAL-A3, Refª 50303D	27	63 199,96 €	23/08/2021
						Mira Trijicon ACOG 4x32 + Mira holográfica Trigicon RMR, para aplicação na espingarda de Assalto HK 417 A2 13" (Special Operations Forces - SOF)	5	15 049,97 €	14/12/2021
						Lanterna Surefire, Modelo Scout Light, 6V, Vampire com LED branco e infravermelhos. Montagem para arma M75 THUMB SCREW MOUNT	2	1 039,99 €	03/08/2021
	33/DPIE/2019	145/2019	21-05-2020	871 562,00 €	Armas diversas	Pistola-metralhadora HK MP5 N SOF (Lote 1A)	20	77 957,40 €	01/03/2021
						Pistola-metralhadora HK MP5 A5 (Lote 1B)	90	214 979,40 €	01/03/2021
Total GNR							379	514 500,82 €	
PSP	2/DPIE/2021	59/2021	26-07-2021	47 150,00 €	Acessórios	Coldres externos para pistola Glock 9x19 mm	2 050	57 994,50 €	07/09/2021
		62/2021	26-07-2021	11 445,00 €	Acessórios	Porta carregadores	2 100	14 077,35 €	19/08/2021
	20/DPIE/2021	120/2021	09-12-2021	174 000 €	Bastões extensíveis	Bastões extensíveis	2 000	214 020,00 €	15/12/2021
Total PSP							6 150	286 091,85 €	
SEF	2/DPIE/2021	61/2021	26-07-2021	990,00 €	Acessórios	Coldres interiores	100	1 217,70 €	06/10/2021
		60/2021	26-07-2021	7 989,60 €	Acessórios	Coldres externos - saque rápido - Pistola Glock 9x19mm	70	1 832,20 €	06/10/2021
						Coldres externos - nível 3 - Pistola Glock 9x19mm	200	7 995,00 €	06/10/2021
		62/2021	26-07-2021	6 049,50 €	Acessórios	Porta carregadores glock 9mm	1 100	7 440,89 €	09/09/2021
Total SEF							1 470	18 485,79 €	
Total Geral							7 999	819 078,46 €	

Anexo IV – Medida EPI

Tabela 4 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida EPI

FSS	Proc. nº	Contrato nº	Data Início	Valor contratual (s/ IVA)	Designação	Descrição	Execução Material (Unid)	Execução Financeira (c/ IVA)	Data de entrega
GNR	03/DPIE/2019	146/2019	03/10/2019	717 100,00 €	Coletes de proteção balística	Colete balístico exterior Patrulha	357	221 750,55 €	09/07/2021
Total GNR							357	221 750,55 €	
PSP	01/DPIE/2021	42/2021	31/05/2021	28 064,50 €	Outros	Cinturões	2 050	34 519,34 €	02/07/2021
		43/2021	31/05/2021	36 531,00 €	Outros	Algemas	2 050	44 933,13 €	06/07/2021
Total PSP							4 100	79 452,47 €	
SEF	01/DPIE/2021	43/2021	31/05/2021	5 346,00 €	Outros	Algemas c/ porta Algemas	300	6 575,58 €	08/07/2021
		44/2021	04/06/2021	5 446,80 €	Outros	Luvas táticas	306	6 699,56 €	30/07/2021
Total SEF							606	13 275,14 €	
Total Geral							5 063	314 478,16 €	

Anexo V – Medida EAAOp

Tabela 5 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida EAAOp

FSS	Proc. nº	Contrato nº	Data Início	Valor contratual (s/ IVA)	Designação	Execução Material (Unid)	Execução Financeira (c/ IVA)	Data de entrega
GNR	41/DPIE/2020	68/2020	27/10/20	36 158,00 €	Mobiliário para o diversos Postos da GNR - Armários Diversos - Lote 1	83	28 053,84 €	21/01/2021
	71/DPIE/20	92/2021	10/09/21	36 645,84 €	Armários diversos para o PT de Medas - Lote 1	51	11 719,14 €	02/11/2021
					Armários diversos para DT Alenquer - Lote 1	142	33 355,24 €	08/11/2021
		93/2021	10/09/21	22 884,00 €	Mobiliário escritório para o PT de Medas - Lote 2	117	7 992,54 €	26/10/2021
					Mobiliário escritório para o DT Alenquer - Lote 2	254	18 494,28 €	26/10/2021
		95/2021	07/09/21	8 900,20 €	Mobiliário aquartelamento para o PT de Medas - lote 3	37	3 684,83 €	27/10/2021
					Mobiliário aquartelamento para o DT Alenquer - Lote 3	79	7 262,41 €	03/11/2021
		94/2021	07/09/21	3 140,00 €	Mobiliário refeitório para o PT de Medas - Lote 4	20	1 544,88 €	27/10/2021
					Mobiliário refeitório para o DT Alenquer - Lote 4	30	2 317,32 €	26/10/2021
Total GNR						813	114 424,48 €	
PSP	02/DPIE/2020	61/2020	15/10/20	42 802,00 €	Mobiliário escritório para reequipar instalações - Lote 1	99	5 623,56 €	14/10/2021
		62/2020	15/10/20	36 845,00 €	Mobiliário comum para reequipar instalações - Lote 2	295	29 895,15 €	14/10/2021
		63/2020	14/10/20	19 986,00 €	Mobiliário para Esqª de Valongo - Lote 3	165	17 106,84 €	22/09/2021
		64/2020	15/10/20	15 450,00 €	Mobiliário para Esqª da Pontinha - Lote 4	137	19 003,50 €	29/12/2021
		65/2020	15/10/20	23 874,00 €	Mobiliário para a Esqª de São Domingos Benfica - Lote 5	232	17 517,66 €	31/12/2021
	07/DPIE/2020	33/2021	23/04/21	18 468,29 €	Aquisição de equipamentos de desporto educação física e ginásio para o ISCPSP/PSP	266	22 613,91 €	12/10/2021
	04/DPIE/2021	113/2021	29/10/21	61 452,61 €	Mobiliário Reequipamento PSP - Lote 1	566	55 560,93 €	23/12/2021
		114/2021	29/10/21	8 217,92 €	Mobiliário - Antigo Salão Nobre ISCPSP - Lote 2	171	10 108,04 €	22/11/2021
		115/2021	29/10/21	37 933,00 €	Mobiliário COMETPOR - Divisão Matosinhos - Lote 3	202	46 657,59 €	10/12/2021
		116/2021	29/10/21	33 796,60 €	Mobiliário-CD FARO-Esq. VR St António - Lote 4	295	41 569,82 €	20/12/2021
		117/2021	29/10/21	11 835,00 €	Mobiliário - Esquadra Torres Novas - Lote 5	69	14 557,05 €	18/11/2021
		118/2021	29/10/21	8 411,50 €	Mobiliário - Esquadra Moura - Lote 6	45	10 346,15 €	18/11/2021
		119/2021	29/10/21	29 690,00 €	Mobiliário - CD Beja/Ampliação e ESA - Lote 7	277	36 511,10 €	07/12/2021
	21/DPIE/2021	128/2021	24/11/21	31 471,00 €	Equipamento hotelaria e eletrodomésticos	282	38 709,33 €	20/12/2021
Total PSP						3 101	365 780,63 €	
Total Geral						3 914	480 205,11 €	

Anexo VI – Medida EFE

Tabela 6 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida EFE

FSS	Proc. nº	Contrato nº	Data Início	Valor contratual (s/ IVA)	Designação	Descrição	Execução Material (Unid)	Execução Financeira (c/ IVA)	Data de entrega
PSP	06/DPIE/2021	69/2021	30/07/21	955 900,00 €	Equipamentos trânsito	Sistemas de BackOffice	6	61 475,40 €	15/11/2021
					Equipamentos trânsito	Sistema de controlo de velocidade radar	19	1 114 281,60 €	15/11/2021
		68/2021	30/07/21	287 968,00 €	Equipamentos trânsito	Cinemometro #Laser Cam#	32	354 200,64 €	18/11/2021
		66/2021	30/07/21	144 450,00 €	Alcoolímetros	Alcoolímetros Quantitativos	50	177 673,50 €	23/12/2021
		71/2021	30/07/21	32 180,00 €	Equipamentos trânsito	Bloqueador de veículos ligeiros	100	31 488,00 €	11/10/2021
					Equipamentos trânsito	Bloqueador de veículos TT e autocaravanas	20	8 093,40 €	11/10/2021
		70/2021	30/07/21	41 580,00 €	Equipamentos trânsito	Equip. de leitura digital de tacógrafos	63	51 143,40 €	27/10/2021
		67/2021	30/07/21	98 449,26 €	Alcoolímetros	Alcoolímetros Qualitativos	169	121 092,59 €	23/12/2021
Total PSP							459	1 919 448,53 €	
Total Geral							459	1 919 448,53 €	

Anexo VII – Medida STIC

Tabela 7 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida STIC

Projeto	Entidade	Procedimento n.º	Objeto	Execução (EUR)					Total (EUR)
				2017	2018	2019	2020	2021	
9487- Comunicações de Segurança e emergência	SGMAI	PPP SIRESP	Parceria Público-Privada SIRESP	40 754 025	45 306 739	22 168 365	25 273 650	12 084 962	145 587 740
		34/OTR/DSUMC/19 e 5/OTR/DSUMC/21	Fornecimento de energia elétrica, inclui juros de mora	270 952	289 477	260 023	262 856	129 485	1 212 793
			Cedências e arrendamento de espaços das Antenas SIRESP	110 861	38 428	39 007	32 655	46 287	267 238
		30/DSUMC/2019	LICENÇAS SOFTWARE MCADI MENSAGENS REDE SIRESP			212 242	24 471	12 236	248 949
		45/DSUMC/19	Aquisição de bens com instalação para reforço da cobertura rádio da rede SIRESP Aeroporto Humberto Delgado			96 170	300 937	13 709	410 816
		107/DSUMC/18 e 140/DSUMC/19 e 129/DSUMC/2020 e 112/DSUMC/2020 e 19/DSUMC/21	Serviços de consultadoria técnica			68 302	67 582	53 249	189 133
			Cedência espaços MEO		72 997	86 270	59 725	59 725	278 717
		87/DAL/DSUMC/2020 e 48/DAL/DSUMC/2021	Ações de formação em segurança e cartões de acesso às instalações do Aeroporto de Lisboa				1 734	684	2 418
		75/DAL/DSUMC/21	Fornecimento e instalação de peças de Ar Condicionado para substituição de elementos dos equipamentos de 3 Estações Base e MSO do Funchal na Madeira					5 435	5 435
		81/DAL/DSUMC/21	Limpeza da vegetação excessiva no perímetro exterior de segurança da Estação Base SIRESP de Penamaior - Paços de Ferreira					590	590
		15/DSUMC/20	Aq. estudos cobertura rádio e surveys rede SIRESP					7 362	7 362
		55/DAL/DSUMC/21	Aquisição de serviços de manutenção da Torre da EB SIRESP de Monsanto em Lisboa					1 453	1 453
		46/DAL/DSUMC/21	Aquisição de unidade de alimentação ininterrupta (UPS) para o COG sito no polo da SGMAI no Tagus Park					5 325	5 325
		74/DAL/DSUMC/21	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado para o 2 Trimestre de 2021					1 281	1 281
		114/DAL/DSUMC/21	Aquisição de serviços de Inspeção Técnica à Torre da Estação Base SIRESP de Arraiolos					2 749	2 749
		51/DSUMC/21	Aquisição de serviços de supervisão, suporte e manutenção para as estações móveis SIRESP da ANEPC					88 671	88 671
		45/DSUMC/21	Aquisição de serviços de estudo e avaliação das infraestruturas de 9 Torres da rede SIRESP					21 771	21 771
		20/DSUMC/21	Aquisição de serviços de utilização e manutenção de software de geolocalização					124 999	124 999
		137/DAL/DSUMC/21	Aquisição de peças para a viatura Mitsubishi Canter 52-DS-26 GNR					1 131	1 131
		Total - Projeto 9487				41 135 838	45 707 641	22 930 379	26 023 610
11576-RESN - Rede de Emergência e Segurança Nacional	SGMAI	112/DSUMC/20	Aquisição de serviços de consultoria técnica					36 863	36 863
		104/DSUMC/20	Aquisição de Serviços de Consultadoria TETRA					24 140	24 140
	Total - Projeto 11576				0	0	0	0	61 003

Tabela 7 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida STIC (continuação)

Projeto	Entidade	Procedimento n.º	Objeto	Execução (EUR)					Total (EUR)
				2017	2018	2019	2020	2021	
9777-112.PT - Financiamento Adicional	SGMAI	75/DSUMC/19 e 74/DSUMC/19	Contrato de manutenção do 112.pt	771 773	738 987	735 030	1 047 562	1 075 974	4 369 327
		10/OTR/DSUMC/19, 42/OTR/DSUMC/19, 144/DSUMC/19, 145/DSUMC/19, 146/DSUMC/19, 10/OTR/19 3 68/DSUMC/20, 69/DSUMC/20 e 70/DSUMC/20	Serviços SMS para o 112.pt		984	2 950	4 150	4 403	12 487
		20/DSUMC/19, 128/DSUMC/19 e 160/DSUMC/19	Serviço de aluguer de Primários com comunicações 112.pt			13 449	18 567	19 091	51 108
			Arrendamento do edifício do CONOR 112.	57 465	149 409	138 577	139 798	140 214	625 463
		33/OTR/DSUMC/19 e 34/OTR/DSUMC/2019 e 5/OTR/DSUMC/21	Fornecimento de energia elétrica	50 614	46 264	43 964	38 618	37 357	216 816
		68/DSUMC/2017 e 129/DSUMC/18 e 102/DAL/DSUMC/19 e 72/DAL/DSUMC/19	Manutenção dos equipamentos CONOR		21 955	31 426	19 363	19 778	92 522
		44/DAL/DSUMC/19 e 93/DAL/DSUMC/2020 e 25/DAL/DSUMC/21	Serviços técnico responsável de instalações elétricas (TREIE) Conor			1 100	1 200	1 200	3 500
		170/DAL/DSUMC/19 e 24/DAL/DSUMC/21	Serviço reparação de aparelho de ar condicionado e UPS existentes no CONOR 112 do Porto			5 166		954	6 120
		66/DAL/DSUMC/21	Aquisição de serviços de reparação de 12 cadeiras do atendimento do 112.PT - CONOR					1 963	1 963
		95/DAL/DSUMC/21	CONOR - Aquisição de materiais para substituição da iluminação da sala de operações do centro de atendimento 112 Norte					3 926	3 926
		96/DSUMC/20	Serviços de Gestão técnica do 112					62 022	62 022
		144/DAL/DSUMC/21	Aquisição de auriculares para Centros Operacionais 112.pt					6 088	6 088
		175/DAL/DSUMC/21	Aquisição de iluminação de emergência e de presença com instalação para o Centro Operacional 112COSul					1 298	1 298
		201/DAL/DSUMC/21	Aquisição de UPS para a sala de operações do 112COSul sito no polo da SGMAI no Tagus Park					5 914	5 914
		229/DAL/DSUMC/21	Aquisição de ventilador para equipamentos de Unidade Close Control UCC02, e filtros para as Unidades UCC01 e UCC02					600	600
Total - Projeto 9777				879 852	957 598	971 662	1 269 259	1 380 782	5 459 154
10096-112.PT - Investimentos Complementares	SGMAI	74/DSUMC/19	Ser. atualização tecnológica e extensão a Açores e Madeira				1 251 150	417 050	1 668 200
Total - Projeto 10096				0	0	0	1 251 150	417 050	1 668 200
10100-Microsoft - Licenciamento Informático para a Segurança Interna	SGMAI	146/DSUMC/18	Licenciamento Microsoft "Servidores e Core Cal"	3 012 591		5 521 662	5 521 662	5 521 662	19 577 576
Total - Projeto 10100				3 012 591	0	5 521 662	5 521 662	5 521 662	19 577 576
10103-GEOMAI - Projetos a Candidatar	SGMAI	23/DSUMC/17 e 73/DSUMC/19 e 45/DSUMC/2020 e 71/DSUMC/21	Licenciamento Enterprise License Agreement (ELA) geolocalização	220 847	220 847	220 847	364 695	492 000	1 519 235
		115/DAL/DSUMC/21	Aquisição de bolsa de horas para acompanhamento inicial e passagem de conhecimento associado ao projecto					6 089	6 089
Total - Projeto 10103				220 847	220 847	220 847	364 695	498 089	1 525 324

Tabela 7 - Resumo dos contratos com execução material e financeira, em 2021 – Medida STIC (continuação)

Projeto	Entidade	Procedimento n.º	Objeto	Execução (EUR)					Total (EUR)	
				2017	2018	2019	2020	2021		
10359-Outros Equipamentos de TIC para as Forças de Segurança	GNR	71/DSUMC/20	Lotes A a D - Computadores de secretária, portáteis e periféricos				582 466	31 069	613 535	
		73/DSUMC/20	Switches e Equipamento de rede					115 551	115 551	
		79/DSUMC/20	Equipamento VOIP-SIP					42 947	42 947	
		22/DSUMC/21	Aquisição de terminais e kits de videoconferência					68 960	68 960	
		30/DSUMC/21	Aquisição de Mini Pc's					54 094	54 094	
		30/DSUMC/21	Aquisição de impressoras portáteis					9 315	9 315	
		29/DSUMC/21	Aquisição de Bastidores de Rede Equipados					22 847	22 847	
		27/DSUMC/21	Aquisição de Equipamento VOIP-SIP					110 001	110 001	
		13/DSUMC/21	Aquisição de computadores de secretária e periféricos					843 894	843 894	
		37/DSUMC/21	Aquisição de baterias para terminais Sepura STP 8038					57 810	57 810	
		52/DSUMC/21	Aquisição de "Completo Guarda Digital"					1 009 644	1 009 644	
		55/DSUMC/21	Aquisição de Equipamento Switch Lt. A e Firewall Lt. B					152 089	152 089	
		39/DSUMC/21	Aquisição de rádios Tetra e acessórios					1 143 292	1 143 292	
		26/DSUMC/21	Aquisição de UPS					94 564	94 564	
		83/DSUMC/21	Aquisição de software adaptado à atividade de Investigação Criminal					121 879	121 879	
		119/DSUMC/21	Aquisição de sistema de virtualização					17 827	17 827	
		99/DSUMC/21	Aquisição de Incremento da Capacidade de Storage					136 579	136 579	
		102/DSUMC/21	Aquisição de capacidade de backups, respetivo subsistema de conectividade e sistema de virtualização					118 002	118 002	
		87/DSUMC/21	Aquisição de software adaptado a várias necessidades operacionais e administrativas					108 559	108 559	
	Total GNR				0	0	0	582 466	4 258 924	4 841 390
	PSP	83/DSUMC/20	Baterias certificadas originais para equipamentos rádio SEPURA série STP8000, no âmbito da LPIEFSS						40 590	40 590
		38/DSUMC/21	Aquisição de baterias certificadas originais para Rádio Sepura Série STP 8000						41 180	41 180
		13/DSUMC/21	Aquisição de computadores de secretária e periféricos						310 013	310 013
	Total PSP				0	0	0	0	391 783	391 783
Total Projeto - 10359				0	0	0	582 466	4 650 708	5 233 174	
Total Geral				45 249 127	46 886 086	29 644 549	35 012 842	25 190 395	181 983 000	
