



3ª Reunião Global

02.04.2019



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Panorama Global dos Projetos

À DATA DE 29/03/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	54%	59%	Tarefas Críticas: 0
2. Piloto de Voto Eletrónico	54%	60%	Tarefas Críticas: 0
3. Eleições Europeias 2019	32%	37%	Tarefas Críticas: 0

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 29/03/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
2. Piloto de Voto Eletrónico	54%	60%	Tarefas Críticas: 0

NOTAS:

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
2.1. Definição dos Locais de Voto	100%	100%	28/JAN – 08/MAR	
2.2. Membros de Mesa (Évora)	0%	0%	15/ABR – 27/MAI	
2.3. Formação	48%	52%	28/JAN – 25 /MAI	   
2.4. Credenciação	0%	0%	29/MAR – 25/MAI	 
2.5. Lote 1	72%	76%	14/FEV – 09/MAI	 
2.6. Lote 2	56%	62%	07/FEV – 08/MAI	 
2.7. Entregáveis	0%	0%	27/MAI – 07/JUN	   

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 29/03/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
3. Eleições Europeias 2019	32%	37%	Tarefas Críticas: 0

NOTAS:

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
3.1. Logística e Documentação Técnica	54%	55%	07/FEV – 22/MAI	  
3.2. Estratégia de Comunicação	0%	0%	EM ANÁLISE	 
3.3. Gateway SMS3838 - AMA	2%	10%	28/JAN – 29/ABR	   
3.4. Contact Center	0%	0%	01/ABR – 26/MAI	  
3.5. Sala de Situação	0%	0%	09/MAI – 26/MAI	
3.6. Projetos IT	33%	40%	01/JAN – 12/JUN	 
3.7. Operações de Recenseamento	2%	2%	01/JAN – 12/JUN	 

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho





Processos e Procedimentos do Equipamento de Voto Eletrónico:

- A revisão dos processos e procedimentos dos equipamentos de VE está em fase de revisão/validação;
- Previsão de entrega: dia 01/04.



Representação do Voto em Branco e Nulo no Comprovativo de Voto:

- O comprovativo de voto, será impresso com o mesmo número de candidaturas e ordenação do boletim de voto tradicional. Contudo em frente a cada uma das candidaturas, não irá aparecer a respetiva quadricula;
- Após a última candidatura, será indicado “Voto em Branco” e de seguida “Voto Nulo” com a respetiva quadricula assinalada.

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:




Universidade do Minho



Ponto de Situação

Plano de Formação

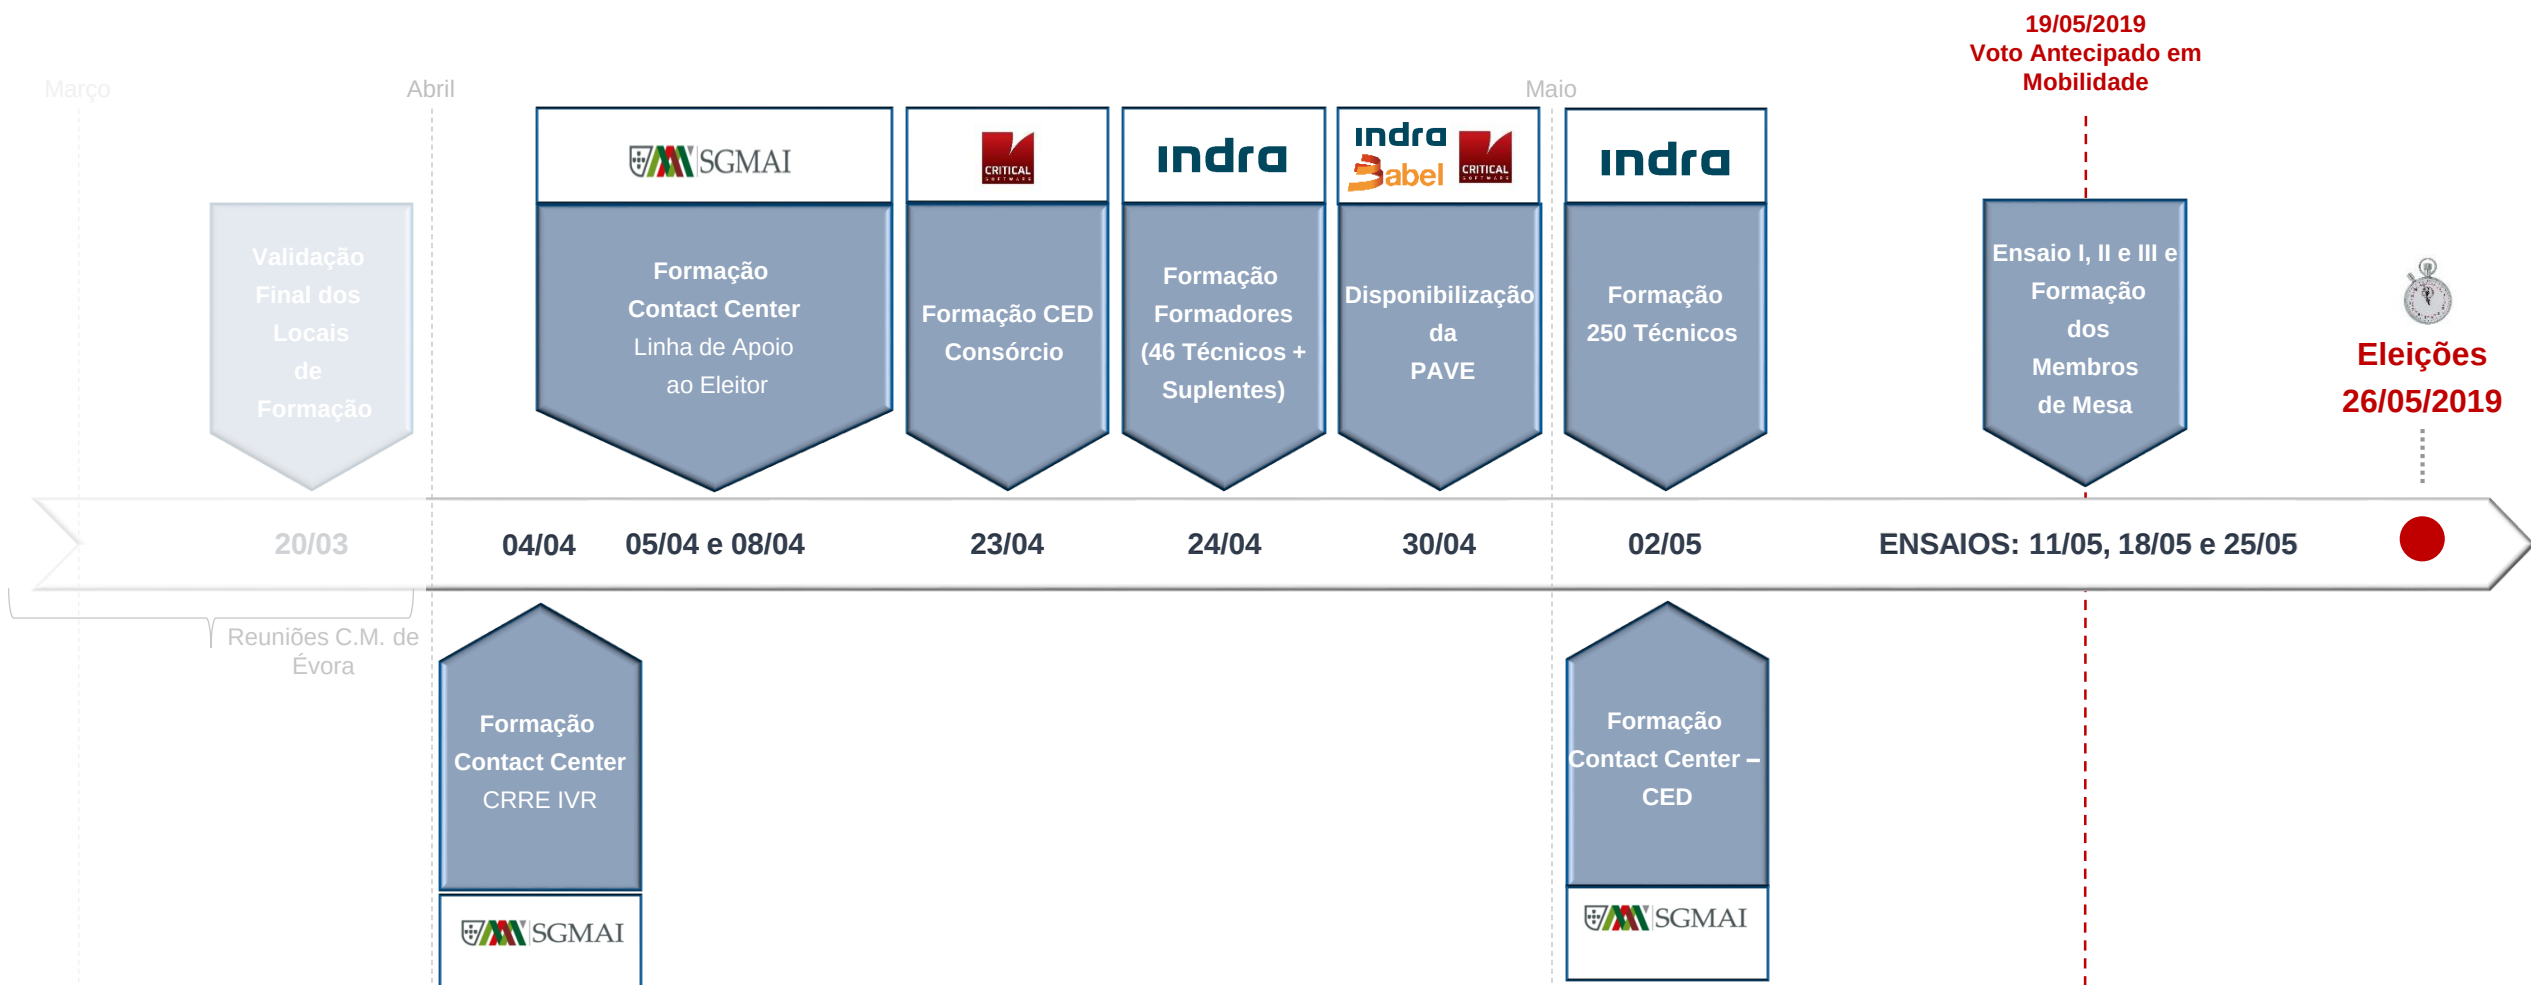

Ponto de Situação

Plano de Formação - Agendas das Formações

Dia	Propósito	Agenda	Responsáveis	Envolvidos	Obs:
04/04	Formação Contact Center	- CRRE - IVR	SGMAI/AE	SGMAI/AE e SN	Manhã
05/04	Formação Contact Center	Introdução à Linha de Apoio ao Eleitor	SGMAI/AE	SGMAI/AE e SN	Parte da Tarde
08/04	Formação Contact Center	- Procedimentos - Alterações legislativas	SGMAI/AE	SGMAI/AE e SN	
23/04	Formação para o Consórcio	- Conceitos Gerais - Guia prático do utilizador - Plano de Contingência	CSW	CSW, INDRA e MEO	
24/04	Formação Formadores (46 Técnicos + Suplentes)	- PVEE - CED	INDRA	INDRA	
02/05	Formação 250 Técnicos	- PVEE - CED	INDRA	Consórcio	
02/05	Formação Contact Center - CED	- Conceitos Gerais - Guia prático do utilizador - Dúvidas	SGMAI/AE	SGMAI/AE e SN	
11/05	Ensaio e Formação I	- Mesa de Voto Eletrónico - CED - Simulação Prática	SGMAI/AE, SGMAI/TIC, INDRA, MEO	SGMAI/AE, SGMAI/TIC, INDRA, MEO, SN e UM	
18/05	Ensaio e Formação II	- Esclarecimento de dúvidas - Testes reais no local	SGMAI/AE, SGMAI/TIC, INDRA, CSW, MEO	SGMAI/AE, SGMAI/TIC, INDRA, CSW, MEO, SN e UM	
25/05	Ensaio e Formação III	- Simulação - Avaliação do processo	SGMAI/AE, SGMAI/TIC, INDRA, CSW, MEO	SGMAI/AE, SGMAI/TIC, INDRA, CSW, MEO, SN e UM	

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Próximas Atividades

Atividades por Projeto



1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

- Conclusão dos materiais de suporte;
- Formação para o Consórcio;
- Testes de carga, intrusão e Code Review;
- Workflow das imagens.

2. Piloto de Voto Eletrónico

- Validação final dos processos e procedimentos do voto eletrónico;
- Testes dos equipamentos entregues no SGMAI;
- Definição do plano de distribuição dos routers e respectivo plano de contingência;
- Identificação de todos os locais com necessidade de reforço de rede.

3. Eleições Europeias

- Conclusão da elaboração do conteúdo para documentação técnica;
- Formação Contact Center;
- Início dos serviços Contact Center (08/04);
- Disponibilização do SIAR;
- Execução dos testes de segurança e intrusão (sistemas).

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 2ª Reunião Global
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Plano de Formação

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ronda de Questões

Questões



4ª Reunião Global – 16.04.2019, 10h30

